

2025 METŲ 002 SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO ĮVYKDYMO ATASKAITA

Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos sl

Programą vykdė: BĮ Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Administracijos Aplinkos apsaugos ir viešosios tvarkos seniūnija, Administracijos Gadūnavo seniūnija, Administracijos Luokės seniūnija, Administracijos I Ryškėnų seniūnija, Administracijos Tryškių seniūnija, Administracijos Upynos seniūnija, Administracijos Viešvėnų seniūnija, Administracijos Žarėnų seniūnija, Administracijos Telšių miesto seniūnija, BĮ Tarnyba.

Programoje 2025 m. numatyta:

01 tikslas. Užtikrinti saugumą ir švarą bendrojo naudojimo teritorijose.

01 uždavinys. Prižiūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius.

02 uždavinys. Vykdyti Telšių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei kelio statinių rekonstrukc

03 uždavinys. Užtikrinti gatvių apšvietimą ir tinkamą gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrenginių

04 uždavinys. Rekonstruoti ir tvarkyti Telšių miesto ir kaimiškų vietovių viešąsias erdves.

05 uždavinys. Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams.

06 uždavinys. Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą.

07 uždavinys. Užtikrinti tvarų judumą Telšių rajone.

02 tikslas. Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką.

01 uždavinys. Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę

02 uždavinys. Prižiūrėti esamą bei plėsti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemą.

03 uždavinys. Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtroje.

04 uždavinys. Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, florą ir fauną.

05 uždavinys. Ugdyti rajono bendruomenės ekologinį sąmoningumą.

03 tikslas. Užtikrinti saugią socialinę aplinką.

02 uždavinys. Siekti didesnio visuomenės saugumo viešosiose erdvėse.


2025 m. planuota įvykdyti 65 priemonės (kurioms skirta / panaudota asignavimų): **14 098 926,98**

faktiškai įvykdytos – 56 priemonės (pasiektos visos rodiklių reikšmės);

iš dalies įvykdytos – 8 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);

neįvykdyta – 1 priemonė (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).

2025 m. SVP 002 programos įvykdymas

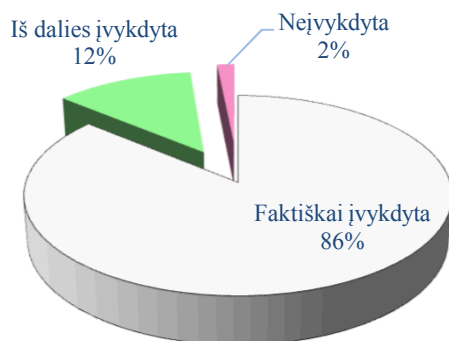

PROGRAMOS

kyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas.

s ir urbanistikos skyrius, Administracijos
os skyrius, Administracijos Degaičių
Nevarėnų seniūnija, Administracijos
racijos Varnių seniūnija, Administracijos
Telšių rajono savivaldybės Priešgaisrinė

ijos ir naujos statybos darbus.
priežiūrą rajono gyvenvietėse.

aplinkai.

Eur / 13 024 665,48 Eur;

2025 metų 002 Saugios aplinkos užtikrinimo programos įvykdymo ataskaita

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur)	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur)	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur)	Įvykdymas procentais
002	Saugios aplinkos užtikrinimo programa	13,183,721.49	14,098,926.98	13,024,665.48	92.38
002-01	Užtikrinti saugumą ir švarą bendrojo naudojimo teritorijose	8,904,280.76	9,142,172.25	8,359,429.18	91.44
002-01-01 (T)	Prižiūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius	1,488,500.00	1,508,700.00	1,501,311.25	99.51
002-01-01-01 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Degaičių seniūnijoje	80,860.00	79,940.00	79,939.69	100.00
002-01-01-02 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Gadūnavo seniūnijoje	89,920.00	89,010.00	89,006.28	100.00
002-01-01-03 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Nevarėnų seniūnijoje	76,510.00	75,640.00	75,638.22	100.00
002-01-01-04 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Luokės seniūnijoje	78,140.00	77,250.00	77,249.80	100.00
002-01-01-05 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Ryškėnų seniūnijoje	141,020.00	139,950.00	139,949.82	100.00
002-01-01-06 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Tryškių seniūnijoje	96,900.00	91,800.00	88,117.96	95.99
002-01-01-07 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Varnių seniūnijoje	178,660.00	176,990.00	176,988.78	100.00
002-01-01-08 (TP)	Vietinės reikšmių kelių priežiūra Viešvėnų seniūnijoje	96,320.00	95,220.00	95,216.32	100.00
002-01-01-09 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Upynos seniūnijoje	84,760.00	83,790.00	83,789.66	100.00
002-01-01-10 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Žarėnų seniūnijoje	46,710.00	46,210.00	46,208.48	100.00
002-01-01-11 (TP)	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje	268,700.00	320,000.00	319,929.71	99.98

[illegible]

[illegible]

002-01-04-21 (TP)	Telšių miesto ir rajono viešųjų erdvių remonto darbai	233,572.00	203,072.00	193,347.50	95.21
002-01-04-22 (TP)	Viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste	316,000.00	251,800.00	231,722.84	92.03
002-01-04-30 (TE)	Projekto „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas	3,688.00	3,688.00	3,688.00	100.00
002-01-04-31 (TP)	Projekto „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas	8,330.00	8,330.00	8,329.55	99.99
002-01-04-34 (TP)	Savivaldybės infrastruktūros plėtra, planavimas ir įgyvendinimas	186,388.67	191,833.67	5,445.00	2.84

002-01-04-35 (PP)	Projekto „Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ įgyvendinimas	76,230.00	152,410.21	73,877.05	48.47
002-01-04-36 (RE)	Projekto „Teritorijos šalia Naujosios gatvės atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas	160,000.00	20,000.00		0.00
002-01-04-37 (RE)	Projekto „Teritorijos, esančios Parko g. 15A, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas	81,000.00	30,000.00		0.00
002-01-04-38 (RE)	Projekto „Telšių miesto senamiesčio teritorijos atgaivinimas ir humanizavimas“ įgyvendinimas	215,000.00	64,100.00	53,826.39	83.97
002-01-04-39 (RE)	Projekto „Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas	37,100.00	20,000.00		0.00

002-01-04-40 (RE)	Projekto „Telšių miesto urbanizuotos teritorijos, esančios nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, atgaivinimas ir žalinimas“ įgyvendinimas	80,000.00	15,900.00		0.00
002-01-05 (T)	Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	507,669.33	623,161.29	570,940.45	91.62
002-01-05-01 (TP)	Telšių rajono savivaldybei priklausančio būsto priežiūra, remontas ir administravimas	332,500.00	489,071.96	439,023.93	89.77
002-01-05-02 (TP)	Daugiabučių namų renovacijos ir bendro naudojimo teritorijų projektų rėmimas	27,000.00	26,800.00	26,718.71	99.70
002-01-05-03 (TP)	Viešojo naudojimo plotų priežiūra: Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Titeniškių seniūnijoje, Užkajonių seniūnijoje, Žemaitės seniūnijoje	58,169.33	55,789.33	53,719.32	96.29

002-01-05-08 (TP)	Šildymo sistemų remontas	90,000.00	51,500.00	51,478.49	99.96
002-01-06 (T)	Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą	1,000,000.00	1,766,310.48	1,666,426.12	94.35
002-01-06-01 (TP)	Keleivių vežimo organizavimas	1,000,000.00	1,766,310.48	1,666,426.12	94.35
002-01-07 (P)	Užtikrinti tvarų judumą Telšių rajone	271,600.00	49,800.00	4,840.00	9.72
002-01-07-01 (RE)	Projekto „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra palei Masčio ežero pakrantę, Saulėtekio g. ir Lygumų g.“ įgyvendinimas	156,000.00	30,000.00		0.00

002-01-07-02 (RE)	Projekto „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra Telšių miesto Parko g. ir Malūno g.“ įgyvendinimas	65,100.00	9,800.00	4,840.00	49.39
002-01-07-03 (RE)	Projekto „Telšių miesto darnaus judumo priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įrengimas“ įgyvendinimas	50,500.00	10,000.00		0.00
002-02	Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką	3,244,429.84	3,939,929.84	3,649,520.41	92.63
002-02-01 (T)	Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę aplinkai	14,400.00	9,300.00	9,201.71	98.94
002-02-01-07 (TP)	Beglobių naminių gyvūnų kontrolės priemonių vykdymas	14,400.00	9,300.00	9,201.71	98.94
002-02-02 (T)	Priziūrėti esamą bei plėsti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemą	208,580.00	211,580.00	209,262.54	98.90
002-02-02-04 (TP)	Telšių miesto ir rajono lietaus nuotekų tinklų remonto ir renovavimo darbai	75,000.00	62,000.00	61,427.89	99.08
002-02-02-11 (TE)	Projekto „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ įgyvendinimas	7,580.00	7,580.00	7,580.00	100.00
002-02-02-13 (TP)	Buitinių nuotekų tvarkymas	110,000.00	126,000.00	124,927.99	99.15
002-02-02-14 (TP)	Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 m. programos parengimas ir įgyvendinimas	16,000.00	16,000.00	15,326.66	95.79
002-02-03 (T)	Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtroje	2,504,908.18	2,833,508.18	2,698,398.60	95.23

[illegible]

002-02-03-09 (TP)	Paplūdimių ir maudyklų pakrančių priežiūra ir tvarkymas	36,000.00			0.00
002-02-03-11 (TP)	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įsigijimas	12,000.00	12,000.00	9,365.40	78.05
002-02-03-12 (RE)	Projekto „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“ įgyvendinimas	25,000.00	25,000.00		0.00
002-02-04 (T)	Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, florą ir fauną	513,041.66	882,041.66	729,160.16	82.67
002-02-04-01 (TI)	Masčio ežero pietinės dalies apsauginio pylimo atstatymo darbai	300,000.00	555,000.00	526,553.22	94.87
002-02-04-02 (TP)	Želdynų atkūrimas ir tvarkymas	90,796.43	201,596.43	82,635.08	40.99
002-02-04-03 (TP)	Ižuvinimo medžiagos įsigijimas	5,000.00	5,000.00	4,999.72	99.99
002-02-04-04 (TP)	Saugomų teritorijų, gamtos paminklų steigimas ir tvarkymas	8,000.00	8,000.00	4,957.00	61.96
002-02-04-05 (TP)	Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonių vykdymas	2,000.00	2,000.00		0.00
002-02-04-06 (TP)	Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms vykdyti	78,421.23	79,621.23	79,301.21	99.60
002-02-04-09 (TP)	Telšių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas	9,000.00	11,000.00	10,890.00	99.00
002-02-04-10 (TP)	Projekto „Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“ įgyvendinimas	19,824.00	19,824.00	19,823.93	100.00
002-02-05 (T)	Ugdyti rajono bendruomenės ekologinį sąmoningumą	3,500.00	3,500.00	3,497.40	99.93

002-02-05-01 (TP)	Ekologinio švietimo priemonių vykdymas	3,500.00	3,500.00	3,497.40	99.93
002-03	Užtikrinti saugią socialinę aplinką	1,035,010.89	1,016,824.89	1,015,715.89	99.89
002-03-02 (T)	Siekti didesnio visuomenės saugumo viešosiose erdvėse	1,035,010.89	1,016,824.89	1,015,715.89	99.89
002-03-02-01 (TP)	Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas	18,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
002-03-02-02 (TP)	Telšių miesto vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas	85,000.00	65,100.00	65,100.00	100.00
002-03-02-03 (TP)	Trūkstančių policijos pareigūnų įdarbinimo skatinimas	25,000.00	4,500.00	4,500.00	100.00
002-03-02-04 (TP)	Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas	907,010.89	932,224.89	931,115.89	99.88
002-03-02-05 (PP)	Projekto „Telšių rajono savivaldybės priedangų infrastruktūros atsparumo ir prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas				
002-03-02-06 (PP)	Projekto „Telšių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas laikiną prieglobstį gaunantiems asmenims būtinomis priemonėmis“ įgyvendinimas				
	Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	13,163,621.49	13,995,009.77	12,934,589.91	92.42
	Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	7,112,928.00	8,184,816.28	7,736,458.01	94.52

	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	3,767,000.00	3,847,600.00	3,843,244.61	99.89
	Pajamų įmokos ir kitos pajamos	580,858.00	649,658.00	374,572.58	57.66
	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	644,900.00			
	Skolintos lėšos	224,800.00	224,800.00	58,666.39	26.10
	Ankstesnių metų likučiai	833,135.49	1,088,135.49	921,648.32	84.70
	Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	20,100.00	103,917.21	90,075.57	86.68
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	13,183,721.49	14,098,926.98	13,024,665.48	92.38
	Iš jų: Regioninė pažangos priemonė	869,700.00	224,800.00	58,666.39	26.10

kaita

Rezultato / Produkto				Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai
Rodiklis	Mato vnt.	2025 m.		
		Planas	Faktas	
Vietinės reikšmės kelių su patobulinta (asfalto) danga ilgis palyginti su bendru vietinės reikšmės kelių ilgiu	proc.	7.20	7.20	
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	114,12	114.35	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	117,75	117.75	
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	142,93	142.93	
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	131,08	134.52	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	110,10	109.57	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	134,11	132.55	Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl įgyvendintų priežiūros priemonių apimtys pagal poreikį. Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	234,73	234.94	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	134,11	132.83	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	154,38	152.86	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis	km	76,95	76.95	
Prižiūrimų vietinės reikšmės gatvių ilgis	km	88,76	91.40	Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.

Prižiūrėtų gatvių dalis nuo poreikio	proc.	100,00	100.00	
Igyvendintų gatvių rekonstravimo, naujos statybos ir kapitalinio remonto projektų skaičius	vnt.	2.00	3.00	Kapitaliai suremontuota Telšių m. Kauno gatvė, Ryškėnų sen. Lauko Sodos Lendrupio gatvė ir Degaičių sen. Degaičių k. Parko gatvė.
Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką	proc.	80.00	80.00	
Suremontuotų gatvių ilgis	km	0,80	2.50	Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl įgyvendintų priežiūros priemonių apimties pagal poreikį.
Įdiegtų saugaus eismo priemonių dalis nuo poreikio	proc.	100,00	100.00	
Prižiūrima gatvių apšvietimo sistemos dalis nuo turimos bendros apšvietimo sistemos	proc.	100.00	100.00	
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Degaičių seniūnijoje	vnt.	136,00	177.00	Šviestuvų skaičius padidėjo, nes buvo įrengtas naujas apšvietimas Parko g. Degaičiuose, Gedimino g. Eigirdžiuose ir Kontrimų g. Birikų kaime.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Gadūnavo seniūnijoje	vnt.	151,00	151.00	
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Luokės seniūnijoje	vnt.	207,00	207.00	
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Nevarėnų seniūnijoje	vnt.	169,00	193.00	Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Ryškėnų seniūnijoje	vnt.	153,00	145.00	Šviestuvų skaičius sumažėjo dėl keičiamų senų šviestuvų į didesnės apšvietos LED šviestuvus.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Telšių miesto seniūnijoje	vnt.	3.443,00	3.701,00	Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Tryškių seniūnijoje	vnt.	227,00	433.00	Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Tryškių seniūnijoje padidėjo, nes buvo vykdomi AB Via Lietuva ir Savivaldybės administracijos projektai 2022 m. Tryškių seniūnija savo lėšomis įrengė gatvių apšvietimą Raudondvario g. (4 vnt.), Klaipėdos g. (6 vnt.), Žaliojoje g. (4 vnt.), Paupio g. (5 vnt.), Žemdirbių g. (2 vnt.).

Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Upynos seniūnijoje	vnt.	151,00	164,00	Šviestuvų skaičius išaugo, nes buvo naujai įrengtas gatvių apšvietimas Upynos seniūnijoje, Gintenių k., Dauginiukų ir Klyniukų gatvėse.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Varnių seniūnijoje	vnt.	396,00	396,00	
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Viešvėnų seniūnijoje	vnt.	318,00	327,00	Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Žarėnų seniūnijoje	vnt.	82,00	91,00	Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
Įgyvendintų gatvių apšvietimo projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	
Apdrausta apšvietimo infrastruktūra	vnt.	1,00	1,00	
Apdrausta apšvietimo infrastruktūra	vnt.	1,00	1,00	
Užtikrinta viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste ir rajone	proc.	100,00	100,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Degaičių seniūnijoje	ha	4,00	4,00	Lėšos už viešųjų erdvių priežiūrą buvo naudojamos pagal poreikį, taupant pajamas nenumatytiems priežiūros darbams. Priemonė įgyvendinta.
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Degaičių seniūnijoje	ha	40,00	40,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Gadūnavo seniūnijoje	ha	2,00	2,00	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Gadūnavo seniūnijoje	ha	13,50	13,50	
Prižiūrimų kapinių plotas Luokės seniūnijoje	ha	3,35	3,35	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Luokės seniūnijoje	ha	75,00	75,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Nevarėnų seniūnijoje	ha	3,50	3,50	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Nevarėnų seniūnijoje	ha	9,28	9,28	
Prižiūrimų kapinių plotas Ryškėnų seniūnijoje	ha	3,00	3,00	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Ryškėnų seniūnijoje	ha	17,00	17,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Telšių miesto seniūnijoje	ha	11,00	11,00	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Telšių miesto seniūnijoje	ha	89,00	89,00	

Prižiūrimų kapinių plotas Tryškių seniūnijoje	ha	10,00	10,00	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Tryškių seniūnijoje	ha	15,00	15,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Upynos seniūnijoje	ha	8,00	8,00	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Upynos seniūnijoje	ha	8,00	8,00	
Prižiūrimų kapinių plotas Varnių seniūnijoje	ha	12,80	12,80	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Varnių seniūnijoje	ha	30,20	30,20	
Prižiūrimų kapinių plotas Viešvėnų seniūnijoje	ha	1,60	1,60	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Viešvėnų seniūnijoje	ha	9,40	9,40	
Prižiūrimų kapinių plotas Žarėnų seniūnijoje	ha	2,20	2,20	
Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Žarėnų seniūnijoje	ha	14,00	14,00	
Prižiūrimų pastatų skaičius Varnių seniūnijoje	vnt.	9,00	9,00	
Prižiūrimų pastatų skaičius Upynos seniūnijoje	vnt.	6,00	6,00	
Prižiūrimų pastatų skaičius Telšių miesto seniūnijoje	vnt.	3,00	3,00	
Įgyvendinta remonto darbų projektų	vnt.	6,00	6,00	Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl sutaupymų vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
Užtikrinta viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste	proc.	100,00	100,00	Lėšos už viešųjų erdvių priežiūrą buvo naudojamos pagal poreikį, taupant pajamas nenumatytiems priežiūros darbams. Priemonė įgyvendinta.
Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką	proc.	20,00	20,00	
Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką	proc.	100,00	100,00	
Prisidėjimas prie savivaldybės infrastruktūros remonto darbų	proc.	100,00	0,00	Buvo planuota įrengti aikštelę Kalno g. 40, Telšiuose, iš Džiugo g. pusės. Atlikus grunto tyrimus paaiškėjo, kad dėl sudėtingų gruntinių sąlygų aikštelės įrengimas būtų neproporcingai brangus, todėl šio projekto nuspręsta atsisakyti. Panaudotos lėšos atstatytos.
Įrengta privažiavimo kelių	m	0,00	0,00	
Įrengta buitinių nuotekų tinklų	m	0,00	0,00	
Įrengta vandentiekio tinklų	m	0,00	0,00	

Igyvendintas projektas	proc.	100,00	88.0	Priemonė įvykdyta. 2025 m. už laidojimo duomenų informacinės sistemos programinę įrangą buvo sumokėta Savivaldybės biudžeto (SB) lėšomis. Metų pabaigoje į priemonę buvo įtrauktos Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (LRVB) lėšos, kadangi gruodžio mėn. šios lėšos buvo gautos. Atitinkamai SB lėšos buvo atstatytos, tačiau strateginis veiklos planas nebuvo patikslintas, todėl susidarė 48,47 proc. nuokrypis. Projektą planuojama galutinai užbaigti iki 2026-04-30. 2026 m. bus deklaruojamos išlaidos už parengtus kapinių informacinės ir duomenų valdymo sistemos nuostatus bei laidojimo duomenų sistemos techninį aprašą.
Informacinės sistemos programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugų įvykdymas	proc.	0,00	0,00	Informacinės sistemos veiklos pradžia numatyta 2026-04-30. Už informacinės sistemos programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugas bus mokama nuo 2026-05-01 iš Savivaldybės biudžeto (SB) lėšų.
Igyvendintas projektas	proc.	5,00	5.00	Rodiklis pasiektas. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta, nupirkto techninio darbo projekto rengimo paslaugos, vyksta projektavimo darbai.
Igyvendintas projektas	proc.	10,00	5.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. Dėl užsitęsusio projekto įgyvendinimo plano vertinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų projektavimo paslaugos nebuvo įsigytos. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas pirkimų planas ir veiklos ataskaitos, taip pat pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.
Igyvendintas projektas	proc.	10,00	10,00	Priemonė įvykdyta. 2025 m. parengti Sinagogos g., Iždinės g. ir Laisvės g. techniniai projektai. 2026 m. bus vykdomi rangos darbai.
Igyvendintas projektas	proc.	5,00	3.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-09-25 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. skirtas finansavimas nebuvo įsisavintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas buvo vykdomas kelis kartus, kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų. Projekto veiklos bus vykdomos 2026 m.

Igyvendintas projektas	proc.	5,00	1.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-11-04 pasirašyta finansavimo sutartis. Įgyvendintos projekto viešinimo veiklos. VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta Veiklos ataskaita, pirkimų planas. Parengti techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai. Viešasis pirkimas 2025-11-19 paskelbtas per CPO LT, tačiau negauta nė vieno pasiūlymo projektavimo paslaugoms. Atsižvelgiant į tai, pirkimo būdas pakeistas į atvirą tarptautinį konkursą ir 2025-12-31 paskelbtas viešasis pirkimas techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms įsigyti. Lėšos buvo numatytos techninio projekto daliai apmokėti, tačiau dėl užsitęsusio PĮP vertinimo pradėtas tik projektavimo paslaugų pirkimas, todėl susidarė lėšų panaudojimo ir rodiklio nukrypimas.
Prižiūrimų savivaldybei priklausančių būstų skaičius nuo visų būstų	proc.	100.00	100.00	
Užtikrinamas rajono įstaigų šildymo sistemų tinkamas funkcionavimas	proc.	100.00	100.00	
Prižiūrimų būstų skaičius	vnt.	336,00	336.00	Priemonė įvykdyta. Nebuvo renkamas biudžetas, todėl atsiskaitymai už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas perkelti į 2026 m. sausį.
Patvirtinta paraiškų dėl prisidėjimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūros atnaujinimo	vnt.	2,00	1.00	Priemonė įgyvendinta. Buvo tik vienas prašymas prisidėti, jis buvo tenkintas ir įgyvendintas.
Prižiūrimų pirčių skaičius	vnt.	12.00	11.00	Lėšų nepanaudota 100 proc. dėl seniūnijų pajamų taupymo. Priemonė įgyvendinta. Upynos seniūnijoje, Kaunatavoje, pirties pastatas parduotas aukciono būdu.
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Gadūnavo seniūnijoje	vnt.	600,00	675.00	Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Luokės seniūnijoje	vnt.	750,00	750.00	

Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Nevarėnų seniūnijoje	vnt.	560,00	560.00	
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Tryškių seniūnijoje	vnt.	850,00	850.00	
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Upynos seniūnijoje	vnt.	110,00	150.00	Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Varnių seniūnijoje	vnt.	1.600,00	1.500,00	Pirtyje apsilankė mažiau gyventojų.
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Viešvėnų seniūnijoje	vnt.	50,00	50.00	
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Žarėnų seniūnijoje	vnt.	300,00	408.00	Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Telšių mieste	vnt.	7.800,00	7.800,00	
Igyvendinta remonto darbų projektų	vnt.	2,00	2.00	
Užtikrinamas susisiekimo viešuoju transportu	proc.	100.00	100.00	
Užtikrinamas keleivių ir moksleivių vežimas viešuoju transportu	proc.	100,00	100.00	Priemonė įvykdyta. Nebuvo renkamas biudžetas, todėl atsiskaitymai už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas perkelti į 2026 m. sausį.
Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	1.00	1.00	Lėšų nuokrypis susidarė dėl užsitęsusių projektų įgyvendinimo planų vertinimo, viešųjų pirkimų procedūrų.
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama	km	0.97	0.97	
Igyvendintas projektas	proc.	5,00	3.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-07-02 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Masčio ežero pakrantės iki Mastupio g. ir iki Kauno g. dviračių takų infrastruktūros techninio projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2025-11-17. Saulėtekio g., Luokės g., Lygumų g. dviračių takų infrastruktūros techninio projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2025-12-08. Už atliktas paslaugas bus atsiskaitoma 2026 m., kada bus parengti techniniai projektai bei gauta teigiama ekspertizės išvada.

Igyvendintas projektas	proc.	10,00	10,00	Visos lėšos nebuvo panaudotos, tačiau pasirašyta projekto finansavimo sutartis, atliktos viešinimo veiklos, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas pirkimų planas bei veiklos ataskaitos ir vykdyti viešieji pirkimai techninio projekto parengimo paslaugoms įsigyti, kas sudaro planuotą rodiklio reikšmę proc.
Igyvendintas projektas	proc.	5,00	3,00	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-06-23 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. skirtas finansavimas nebuvo įsisavintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas šviesoforų postams atnaujinti buvo vykdomas kelis kartus, kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų. Projekto veiklos tęsiamos 2026 m.
Vandens telkinių, tinkančių rekreacijai, dalis nuo visų telkinių (pagal vandens kokybę)	proc.	100,00	100,00	
Sugauta beglobių gyvūnų	vnt.	200,00	80,00	Priemonė įgyvendinta. Bešeimininkių gyvūnų buvo mažiau nei tikėtasi.
Telšių miesto namų ūkių (abonementų), prisijungusių prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo tinklų, dalis nuo visų namų ūkių	proc.	80,00	80,00	
Telšių rajono namų ūkių (abonementų), prisijungusių prie centralizuoto nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo visų namų ūkių	proc.	71,00	71,00	
Suremontuota, įrengta lietaus nuotekų infrastruktūros objektų	vnt.	2,00	2,00	
Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką	proc.	20,00	20,00	
Kompensuotų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius	vnt.	90,00	87,00	Priemonė įgyvendinta. Rodiklis mažesnis, nes dalis paraiškų neatitiko kompensavimo tvarkos nuostatų.
Atliekama aplinkos stebėsena pagal poreikį	proc.	100,00	100,00	Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau, nes nupirktų paslaugų kaina mažesnė, nei planuota.
Atliekų surenkamumas	proc.	100,00	100,00	
Perdirbamų atliekų kiekis nuo visų surenkamų atliekų	proc.	76,00	81,00	Perdirbta daugiau atliekų, nes buvo rasta daugiau bešeimininkių atliekų.

TRATC kaštų padengimas iš vietinės rinkliavos	proc.	100,00	100.00	Priemonė įvykdyta. Telšių regiono atliekų tvarkymo centro per 2026 m. pateiktų sąskaitų už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos išlaikymą suma buvo mažesnė, nei buvo surinkta rinkliavos. Todėl dalis lėšų liko nepanaudota, jos bus naudojamos 2026 m.
Lengvatų padengimas	proc.	100,00	100.00	Lėšų lengvatoms dengti buvo planuota daugiau, nei dėl jų kreiptasi.
Sutvarkyta atliekų	t	90,00	110.00	Priemonė įvykdyta. Rasta daugiau bešeimininkių atliekų nei planuota, tačiau lėšų joms sutvarkyti panaudota mažiau, nes kai kurios atliekos pareikalavo mažesnių sutvarkymo kaštų.
Sutvarkyta pavojingų atliekų	t	0,20	0.00	Nebuvo poreikio tvarkyti pavojingas atliekas. Atlikti ekogeologiniai tyrimai (Telšių g. 66, Luokės mstl.). Skirta lėšų Savivaldybės priešgaisrinei tarnybai absorbentams įsigyti.
Išvežta komunalinių atliekų Degaičių seniūnijoje	m 3	275,00	275.00	
Išvežta komunalinių atliekų Gadūnavo seniūnijoje	m 3	100,00	142.88	Didėjimą lėmė komunalinių atliekų išvežimų pagal grafiką skaičius. 2025 m. – 26 išvežimai, 2024 m. – 18 išvežimų, 2023 m. – 18 išvežimų.
Išvežta komunalinių atliekų Luokės seniūnijoje	m 3	440,00	440.00	
Išvežta komunalinių atliekų Nevarėnų seniūnijoje	m 3	220,00	220.00	
Išvežta komunalinių atliekų Ryškėnų seniūnijoje	m 3	252,00	252.00	
Išvežta komunalinių atliekų Telšių miesto seniūnijoje	m 3	2.000,00	2.000,00	
Išvežta komunalinių atliekų Tryškių seniūnijoje	m 3	250,00	250.00	
Išvežta komunalinių atliekų Upynos seniūnijoje	m 3	132,00	132.00	
Išvežta komunalinių atliekų Varnių seniūnijoje	m 3	340,00	340.00	
Išvežta komunalinių atliekų Viešvėnų seniūnijoje	m 3	154,00	154.00	
Išvežta komunalinių atliekų Žarėnų seniūnijoje	m 3	110,00	116.60	Išvežamų atliekų kiekis padidėjo dėl atsiradusio didesnio poreikio.

Prižiūrėta maudyklų	vnt.	3,00	3.00	Siekiant užtikrinti poilsiautojų saugumą, 2025 m. buvo skelbiamas viešasis pirkimas gelbėjimo paslaugoms įsigyti Gadūnavo ir Varnių sen. esančiuose įteisintuose paplūdimiuose, bet pasiūlymų nebuvo gauta.
Įsigyta atliekų tvarkymo infrastruktūros priemonių	vnt.	40,00	40.00	Lėšų priemonėms įsigyti buvo panaudota mažiau dėl viešųjų pirkimų metų gauto mažesnės kainos pasiūlymo.
Įgyvendintas projektas	proc.	36,00	4.20	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-06-05 pasirašyta finansavimo sutartis, todėl nusitęsė pirkimo procedūros, atitinkamai ir darbų atlikimo terminai.
Rajono teritorijos miškingumas ir želdiniai	proc.	31.00	35.70	Rajono miškingumo procentas didesnis dėl vykdomų medžių sodinimo darbų miško žemėje.
Saugomų teritorijų proc. rajono teritorijoje	proc.	23.70	23.70	
Atlikti pylimo atstatymo darbai	vnt.	1,00	0.90	Dėl papildomų nenumatytų darbų užsitęsė projekto įgyvendinimas. Numatyta darbus baigti 2026 metais.
Atkurta želdynų	ha	0,50	0.10	Nupirkta apželdinimo projekto įgyvendinimo paslauga, tačiau dėl žiemos sezono, didžioji darbų dalis bus atlikta iki 2026 m. gegužės 24 d.
Įžuvinta ežerų	vnt.	2,00	1.00	Siekiant maksimalaus metinio išteklių gausinimo, nuspręsta įžuvinti 1 vandens telkinį – Tausalo ežerą.
Sutvarkyta saugomų objektų	vnt.	3,00	3.00	Priemonė įgyvendinta. Lėšos skirtos pagal poreikį: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai Telšių rajone esančių gamtos, kultūros vertybių ir kitų rekreacinių teritorijų priežiūrai vykdyti, Degaičių sen. medžiams persodinti.
Likviduota ypatingųjų ekologinių situacijų dalis nuo visų ypatingųjų ekologinių situacijų	proc.	100,00	0.00	Nebuvo poreikio.
Patenkinta paraiškų dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	100,00	54.00	Gautos 26 paraiškos, iš jų 12 neatitiko tvarkos aprašo nuostatų.
Inventorizuota želdinių	ha	130,00	320.00	Paslauga nupirkta už mažesnę lėšų sumą, todėl pavyko nupirkti didesnę inventorizavimo plotą.
Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką	proc.	100,00	100,00	
Ekologiniuose renginiuose, akcijose dalyvaujančių rajono gyventojų dalis	proc.	5.00	5.00	

Prenumeruota leidinių	vnt.	40,00	29.00	Atsisakyta žurnalo „Miškai“ prenumeratos.
Nusikalstamumo lygis (įregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų)	vnt.	1340.00	1338.70	Nusikaltimų padaryta mažiau nei prognozuota.
Remiamų programų skaičius	vnt.	1,00	1.00	
Eksplloatuojamų kamerų skaičius	vnt.	42,00	49.00	Siekiant užtikrinti saugią aplinką, viešąsias erdves, įdiegtos papildomos vaizdo stebėjimo kameros.
Remiamų policijos pareigūnų skaičius	vnt.	5,00	3.00	Priemonė įvykdyta. Buvo skatinti 3 studentai (po 250,00 Eur per mėnesį). Studijos baigėsi 2025 metų birželį. Prašymų vienkartinę paramą gauti nebuvo pateikta.
Atnaujintos įrangos ir transporto priemonių skaičius	vnt.	5,00	5.00	
Įgyvendintas projektas	proc.	10,00	7.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. Neįsigyti vikšriniai kopikliai ir neįrengtos langų apsaugos priemonės. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VŠĮ Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūrai pateikta veiklos ataskaita bei veiklų ir finansinis grafikas, vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, įrengti dūmų signalizatoriai ir pasirašyta elektros generatorių įrengimo sutartis.
Įgyvendintas projektas	proc.	10,00	7.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebuvo įsigyti pirmosios pagalbos rinkiniai. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VŠĮ Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūrai pateikta veiklos ataskaita bei veiklų ir finansinis grafikas, vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, įsigytos geriamojo vandens talpyklos ir asmens higienos priemonių rinkiniai.

