

PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr _____
teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Radviliškio m.

(2008 - 2019)-ŪJŲ METŲ

Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00033230; T00078399

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

I RADVILIŠKIO Miesto teritorijos bendrasis planas bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

1. Išorės aplinka
2. Urbanistinė aplinka
3. Socialinė - ekonominė infrastruktūra
4. Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio apsauga
5. Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos
6. Susisiekimo infrastruktūra
7. Inžinerinė infrastruktūra

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I RADVILIŠKIO Miesto teritorijos bendrasis planas. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Išorės aplinka					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
1.1	Teritorijų keitimas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.1.1	Radviliškio miesto ribų keitimas (SPP 1.4.1.2.)	Patikslintos ir įregistruotos Radviliškio miesto ribos, atsižvelgiant į Radviliškio miesto bendrojo plano ribas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2016	Įgyvendinta	2016-02-05	Įregistruotas Radviliškio miesto teritorijos administracinių ribų tikslinimo specialusis planas.

1.1.2	Miesto urbanizacija šiaurės, rytų ir pietų kryptimis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose	Parengti teritorijų planavimo ir / ar kiti susiję dokumentai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		Turėtų būti parengti susiję teritorijų planavimo dokumentai, apibrėžti finansavimo šaltiniai.
1.2	Susisiekimo infrastruktūros plėtra tranzitinių srautų nukreipimui					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.2.1	Šiaurinio miesto aplinkkelio įrengimas (RajBP 6.7)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai Įrengtas miesto aplinkkelis, nukreipiantis tranzitinius automobilių srautus nuo miesto teritorijos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD)	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Igyvendinant Radviliškio miesto bendrojo plano sprendinius, buvo patikslintos ir įregistruotos Radviliškio miesto ribos.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nebuvo reikšmingo poreikio atlikti numatytas priemones miesto urbanizacijos apibrėžtumui ir plėtrai šiaurės, pietų ir rytų kryptimis. Dėl mieste mažėjančio gyventojų skaičiaus tendencijų ir susiklosčiusio poreikio vienbučių/dvibučių teritorijų urbanizacijai tikėtina, kad ateityje priemonė gali prarasti aktualumą: per pastaruosius 10 metų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistemos "Infostatyba" viešai prieinamais duomenimis miesto teritorijoje pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus buvo atlikta tik 48 vienbučių/dvibučių pastatų statyba.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Urbanistinė aplinka					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
2.1	Gyvenamųjų teritorijų plėtra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.1.1	Miesto urbanizacijos plėtra daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijose (SPP 1.4.1.9.)	Parengti teritorijų planavimo ir kiti susiję dokumentai (sklypų formavimo dokumentai, techniniai projektai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

2.1.2	Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas (SPP 1.2.2.1., SPP 1.2.2.2.)	Modernizuoti daugiabučiai pastatai.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Daugiabučių namų bendrijos Jungtinės veiklos sutarties dalyviai	Kita		2009	2019	Vykdoma		Šiuo metu yra renovuota 15 daugiabučių namų (Naujojoje, Radvilų, Dariaus ir Girėno, Maironio, Jaunystės, Vaižganto gatvėse) Radviliškio mieste. Dar vieno daugiabučio namo (Stiklo gatvėje) yra atliekama projekto ekspertizė. Iš viso Radviliškio mieste yra išduoti 32 statybų leidimai daugiabučių namų rekonstrukcijai.
2.1.3	Radviliškio miesto teritorijoje esančių sodininkų bendrijų teritorijų konversija į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas (SPP 1.4.1.1.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, reglamentuojantys teritorijų konversijos sąlygas ir aplinkybes, kiti susiję (techniniai) projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2015	Igyvendinta	2015-06-04	Iki 2015 m. birželio 4 dienos buvo parengti ir įregistruoti 6 detalieji planai skirti sodų bendrijų konversijai į gyvenamąsias teritorijas. Taip pat yra išduota statybos leidimų neypatingiems bei vienbučiams statiniams statyti.

2.2	Komerčinės paskirties ir pramonės teritorijų plėtra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
2.2.1	Pramonės, verslo ir komercinių teritorijų vystymas (SPP 2.1.2.2.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2008	2019	Vykdoma		Šiuo metu Radviliškio mieste per visą 2008 - 2019 metų laikotarpį buvo išduoti statybos leidimai 2 paslaugų ir 4 prekybos paskirties naujiems statiniams
2.2.2	Komerčinės paskirties objektų teritorijų plėtra prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2008	2019	Vykdoma		Šiuo metu Radviliškio mieste per visą 2008 - 2019 metų laikotarpį buvo išduoti statybos leidimai 2 paslaugų ir 4 prekybos paskirties naujiems statiniams.

2.2.3	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų plėtra pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai, esamų modernizavimas (SPP 2.1.2.2.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai, rezervuotos teritorijos, modernizavimo projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2008	2019	Vykdoma		Per visą 2008-2019 metų laikotarpį buvo išduoti statybos leidimai 19 sandėliavimo ir 2 sandėliams naujiems statiniams ir 1 statybos leidimas sandėlio rekonstrukcijai
2.2.4	Mišrios pramonės ir sandėliavimo objektų ir komercinės paskirties objektų teritorijų plėtra (SPP 2.1.2.2.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai, rezervuotos teritorijos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2008	2019	Vykdoma		Per visą 2008-2019 metų laikotarpį buvo išduoti statybos leidimai 19 sandėliavimo ir 2 sandėliams naujiems statiniams ir 1 statybos leidimas sandėlio rekonstrukcijai
2.2.5	Mišrios bendro naudojimo erdvių, želdynų ir komercinės paskirties objektų teritorijos plėtra	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

2.3	Kitų teritorijų plėtra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.3.1	Visuomeninės paskirties teritorijų plėtra (RajBP 4.6.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai, rezervuotos teritorijos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3.2	Esamų visuomeninės paskirties objektų modernizavimas	Parengti techniniai projektai modernizavimui, modernizuoti objektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Buvo modernizuoti šie objektai: Vaižganto gimnazija (2012 m. kovo 23 d.); Lizdeikos gimnazija (2013 m. spalio 28 d.); S. Dariaus ir S. Girėno mokykla (2011 m. balandžio 30 d.); Iopšelis-darželis "Kregždutė" (2011 m. balandžio 30 d.). Buvo parengtas projektas Gražinos pagrindinės mokyklos modernizavimui, bet iki šiol dar neįgyvendintas.

2.3.3	Bendro naudojimo erdvių teritorijos - kapinių teritorijos - plėtra (SPP 1.4.1.8., SPP 1.4.2.10.)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2016	Igyvendinta		2013 m. Radviliškio miesto kapinių plėtrai parengtas detalusis planas (ES projektas VP1-4.2-VRM-04-R-61-032). 2016 m. įgyvendinti Radviliškio kapinių plėtros darbai
-------	--	--	---	--	--	------	------	-------------	--	--

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Buvo vykdomas esamų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų modernizavimo procesas: rekonstruojami/kapitališkai remontuojami daugiabučiai gyvenamieji (13 pastatų), visuomeniniai pastatai (švietimo, ugdymo įstaigos), rengti teritorijų planavimo dokumentai sodų konversijos į gyvenamąsias teritorijas procesams, išduoti leidimai ir vyko 49 vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbai. Dirbtinai nebuvo kuriama paklausos neatitinkanti naujų objektų pasiūla. Buvo įgyvendinti bendrajame plane numatyti bendro naudojimo teritorijos (kapinių) plėtros darbai. Išduoti statybos leidimai darbo vietas kuriančių objektų statybai: paslaugų ir komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų įrengimui.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Liko neįgyvendintos priemonės mišrios bendro naudojimo erdvių, želdynų ir komercinės paskirties objektų teritorijos, esančios šalia Eibariškių parko, įsisavinimui ir sutvarkymui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Socialinė - ekonominė infrastruktūra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 15 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 18		
3.1	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.1.1	Sveikatos įstaigų ir paslaugų tinklo optimizavimas (RajBP 2.7.)	Įsteigti Bendrosios praktikos gydytojų (BPG) Profesionalios psichologinės pagalbos kabinetai Optimizuotos ambulatorinės reabilitacijos, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos	VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Radviliškio r. poliklinika VšĮ Radviliškio ligoninė Radviliškio rajono savivaldybės administracija LR Sveikatos apsaugos ministerija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Asmens sveikatos priežiūros tinklas išlaikomas: veikia Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras; VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras; VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Radviliškio ligoninė.

3.1.2	Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas (SPP 3.1.2.1., SPP 3.1.2.6.)	Parengti sveikatos priežiūros įstaigų renovacijos techniniai projektai, modernizuota, renovuota konsultacinių poliklinikų infrastruktūra, ligoninė, Radviliškio rajono greitosios pagalbos centras	VŠĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ Radviliškio r. poliklinika, VŠĮ Radviliškio ligoninė Radviliškio rajono savivaldybės administracija LR Sveikatos apsaugos ministerija	Kita		2008	2018	Įgyvendinta	2018-12-31	2012 m. įgyvendintas projektas "Ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos chirurgijos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvosios pagalbos paslaugų plėtra bei infrastruktūros modernizavimas VŠĮ Radviliškio ligoninėje. Buvo vykdomas naujo Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro techninio projekto parengimas. Darbai buvo baigti 2018 m. gruodžio 31 d.
3.1.3	Pirminės sveikatos priežiūros centrų, ambulatorijų medicininės įrangos atnaujinimas	Įsigyta medicininė įranga	Radviliškio rajono savivaldybės administracija LR Sveikatos apsaugos ministerija Sveikatos įstaigos	Kita		2008	2019	Vykdoma		2012 m. gruodžio 27 d. įsigytas odontologinis įrenginys „Diplomat“.

3.1.4	Greitosios medicinos pagalbos paslaugų gerinimas (SPP 3.1.2.4.)	Įsigytos naujos transporto priemonės greitosios medicinos pagalbos paslaugų gerinimui	Radviliškio rajono savivaldybės administracija LR Sveikatos apsaugos ministerija Sveikatos įstaigos	Kita		2008	2019	Vykdoma		2012 m. įgyvendintas projektas "Ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos chirurgijos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra bei infrastruktūros modernizavimas VŠĮ Radviliškio ligoninėje. 2012 m. VŠĮ Radviliškio ligoninė įsigijo greitosios pagalbos automobilį su medicinos įranga. 2014 m. Radviliškio GMP įsigijo B tipo greitosios pagalbos automobilį.
3.2	Socialinių paslaugų gerinimas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

3.2.1	Slaugos įstaigų, socialinių paslaugų plėtra (SPP 3.1.1.1.)	Optimizuotas stacionarių slaugos ir globos įstaigų, teikiančių nuolatinę įvairiapusę pagalbą neįgaliesiems žmonėms, tinklas įgyvendintos socialinės rizikos asmenų (ypatingai neįgaliųjų ir ilgalaikių bedarbių) integracijos į darbo rinką programos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Vykdoma		VšĮ Radviliškio ligoninėje vaikams nuo 2016 m. sausio 1 d. teikiamos dienos stacionaro paslaugos ir stebėjimo paslaugos (darbo dienomis 8.00-18.00 val.)
3.2.2	Socialinio būsto plėtra ir atnaujinimas (SPP 3.1.4.1.)	Socialinių butų skaičius Atnaujintų socialinių butų skaičius	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Iki šiol atnaujintų socialinių būstų skaičius siekia 120, iš viso Radviliškio mieste yra 186 būstai. Per 2008 - 2019 m. laikotarpį buvo įsigyta naujų socialinių būstų.

3.2.3	Gyventojų kvalifikacijos kėlimo ir integravimo į darbo rinką proceso įgyvendinimas (RajBP 2.2.)	Parengtos ir nuolat įgyvendinamos gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo programos: integruojami į darbo rinką asmenys, neturintys kvalifikacijos, skatinamas Radviliškio darbo biržos, mokslo įstaigų bendradarbiavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio darbo birža	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
3.3	Švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo optimizavimas ir paslaugų gerinimas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		

3.3.1	Švietimo ir ugdymo įstaigų mieste optimizavimas	Parengti įstaigų tinklo optimizavimo ir pertvarkymo planai, planai įgyvendinami	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Įgyvendinta		2012 m. buvo patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas. 2016 m. patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas. Planai įgyvendinti, Radviliškio mieste veikia optimalus bendrojo ugdymo mokyklų skaičius.
-------	---	---	--	--	--	------	------	-------------	--	--

3.3.2	Švietimo įstaigų modernizavimas (SPP 3.2.1.2.)	Parengti techniniai projektai modernizavimui, atlikti renovacijos darbai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		2008 - 2019 metų laikotarpiu buvo išduoti 4 statybos leidimai mokslo paskirties statinių rekonstrukcijai. 2011 m. įgyvendintas ES projektas VP3-3.4-ŪM-04-R-61-005 "Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ ir lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje". 2013 m. įgyvendintas ES projektas VP3-3.4-ŪM-03-V-04-103 "Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimas (modernizavimas)". Parengtas projektas Gražinos pagrindinės mokyklos modernizavimui, tačiau neįgyvendintas.
-------	--	--	--	--	--	------	------	---------	--	---

3.3.3	Švietimo įstaigų mokymo inventoriaus atnaujinimas (SPP 3.2.2.2.)	Atnaujinta mokymosi infrastruktūra: priemonės, kompiuteriai, mokykliniai baldai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, švietimo įstaigos	Kita		2008	2019	Vykdoma		Radviliškyje iki 2018 m. Vinco Kudirkos progimnazijoje įsigyti baldai, žaidimų ir sporto inventorių, kompiuter. įranga; įrengtas mokymo centras „Indigo miestas“ su informacine ir technine baze. Vinco Kudirkos, Vaižganto progimnazijose, Gražinos pagrindinėje mokykloje integruoti gamtos mokslų kabinetai, laboratorijos. Dailės mokykloje įsigyta komunikac. technologijų įranga, baldai. Vaižganto gimnazijoje papildytas sporto inventorių, įrengtas kosminio modeliavimo būrelio pasiekimų muziejus. Vaižganto progimnazijoje įrengta pradinukų laboratorija „Vedlys“. Lizdeikos gimnazijoje įsigyta kompiuter. įranga, atnaujinti
-------	--	---	---	------	--	------	------	---------	--	---

3.3.3	Švietimo įstaigų mokymo inventoriaus atnaujinimas (SPP 3.2.2.2.)	Atnaujinta mokymosi infrastruktūra: priemonės, kompiuteriai, mokykliniai baldai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, švietimo įstaigos	Kita		2008	2019	Vykdoma		kabinetų baldai, Gražinos pagrindinėje mokykloje spec. poreikius turintiems vaikams įrengtas multisensorinis kabinetas, lauko terasa. Lopšeliuose-darželiuose „Žvaigždutė“, „Eglutė“ įsigyti: baldai, žaidimų-sporto priemonės, lauko žaidimų įrenginiai, įrengta bibliotekėlė, "Žalioji sveikatingumo klasė".
3.3.4	Sveikos gyvensenos edukacinių renginių moksleiviams diegimas (SPP 3.3.2.3.)	Mokinams diegiamos sveikos mitybos ir gyvensenos nuostatos ir principai, vykdomas skatinimas aktyviai sportuoti	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Savivaldybės mokyklose vykdytos "Sveikos gyvensenos ugdymo"; „Prisijunk, pajudėk ir keiskis“; „Vasarą pradėk aktyviai!“ ir kt. programos. 2013 m. įgyvendintas projektas „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“, kurio sudėtyje buvo ir sveikos gyvensenos propagavimas.

3.3.5	Mokinių sveiko maitinimo švietimo įstaigose užtikrinimas (SPP 3.2.1.3.)	Renovuoti maitinimo blokai, vykdomos sveikatingumo programos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Vykdoma nuolat.
3.3.6	Moksleivių užimtumo didinimas	Organizuojamos neformalaus užimtumo veiklos, didėjantis vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus, skaičius	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Švietimo įstaigos	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Sistemiškai įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos: Radviliškio dailės, muzikos mokyklose, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje. Didėja dalyvių skaičius, kurie renkasi ir kitų švietimo tiekėjų teikiamas paslaugas. Savivaldybėje plėtojama Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pasiūla ir įgyvendinimas. Naujai vykdomos programos apima vaikų saugaus eisimo, plaukimo pagrindų, saugaus elgesio vandenyje mokymus.

3.3.7	Ugdymo įstaigų modernizavimas	Parengti techniniai projektai modernizavimui, atlikti renovacijos darbai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Vykdytas Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Radviliškio miesto lopšelyje-darželyje „Kregždutė“. Darbai apima patalpų, skirtų metodinei veiklai, vaikams iki vienerių metų, įrengimą; priešmokyklinio ugdymo grupių patalpų remontą; suremontuotų grupių ir ugdymo patalpų baldų ir įrangos atnaujinimą.
-------	-------------------------------	--	--	--	--	------	------	---------	--	--

3.4	Kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.4.1	Muziejų, bibliotekų multifunkcinių paslaugų didinimas (SPP 3.3.1.2, SPP 3.3.1.3.)	Muziejai, bibliotekos įveiklinami kultūros, švietimo ir informacijos sklaidimo funkcijoms Bibliotekos kompiuterizuojamos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija Radviliškio turizmo informacijos centras (TIC)	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		2018 m. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo bibliotekos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2018–2020 m. įgyvendinant projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“ (galimybė bibliotekose naudotis nemokama viešąja interneto prieiga ir mokymai gyventojams naudotis elektroninėmis priemonėmis). Sklaida: Nuo 2004 m. Viešosios bibliotekos leidžiamas

										žurnalas „Radviliškio kraštas“ (išleista 30 numerių), nuo 2018 m. gegužės 17 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo išleistas žurnalas „Kviečia Radviliškio kraštas“, kurio leidyba buvo finansuota Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.
3.4.2	Kultūros ir laisvalaikio įstaigų multifunkcinių paslaugų didinimas	Parengti techniniai projektai, optimizuotos ir pertvarkytos teatrų, kino, koncertų ir kultūros namų salės į universalias sales, gerinama esamų kultūros centrų ir pramogų salių infrastruktūra	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		2014 m. atlikti Radviliškio miesto kultūros centro modernizavimo (renovacijos) darbai

3.4.3	Vykstančių tradicinių renginių, puoselėjamos etninės kultūros populiarinimas (SPP 3.3.1.9.)	Parengtos programos kultūros populiarinimo procesams, vykdomi kultūriniai renginiai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Radviliškio miesto kultūros centras	Savivaldybės biudžeto lėšos		2012	2019	Vykdoma		Radviliškio miesto kultūros įstaigose ne tik organizuojami tradiciniai renginiai, puoselėjamos etninės kultūros tradicijos, veikia amatų dirbtuvės, bet ir vykdomos 6 kultūros paso programos. Stebimos renginių skaičiaus augimo tendencijos (pvz. 2011 m. buvo organizuoti 120 renginiai; 2015 m. - 204; 2017 m. Radviliškio miesto kultūros centre organizuoti 215 renginių, 2018 m. - 238).
3.4.4	Sporto objektų kokybės gerinimas (SPP 3.3.2.2.)	Renovuotas miesto stadionas, atnaujinti sporto aikštynai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Iki 2016 m. atnaujintas Radviliškio miesto stadionas ir tribūna su bėgimo takeliais, įrengti 2 teniso kortai; atnaujintas Lizdeikos gimnazijos stadionas; Jaunimo mokykloje atlikti sporto salės remonto darbai (2014 m.)

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Iš visų bendrajame plane numatytų priemonių socialinės infrastruktūros ir sveikatos paslaugų gerinimui, nepradėtos vykdyti sudaro tik 6 proc. Įgyvendintos priemonės susijusios su paslaugų kokybės gerinimu VŠĮ Radviliškio ligoninėje ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo, ugdymo, kultūros įstaigose modernizuojant jas ir jų infrastruktūrą. Didžioji dalis socialinės infrastruktūros numatytų priemonių yra tęstinio įgyvendinimo, todėl vykdomos nuolat arba periodiškai reaguojant į poreikį (įrangos atnaujinimas, pagalba žmonėms su negalia, socialinės rizikos asmenims, vaikams stacionaro, stebėjimo paslaugos, socialinių būstų pasiūla, švietimo ir ugdymo įstaigų optimizavimo procesas, sveikos mitybos užtikrinimo ir sveiko gyvenimo įpročių skatinimo procesas, didinant gyventojų užimtumą, vykdant sporto įrenginių plėtrą ir įvairiarūšiškumą).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Neįgyvendintas projektas Gražinos pagrindinės mokyklos modernizavimui. Nėra informacijos apie gyventojų kvalifikacijos ir integravimo į darbo rinką apimtį.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio apsauga					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
4.1	Turizmo infrastruktūros plėtra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
4.1.1	Gamtos išteklių pritaikymas turizmui (SPP 2.1.4.7.)	Pritaikyti miesto gamtos išteklių turizmo reikmėms	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

4.1.2	Maitinimo, pramogų ir apgyvendinimo paslaugų įstaigų tinklo plėtra	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai, esamų statinių modernizavimo projektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema "Infostatyba" viešai prieinamais duomenimis miesto teritorijoje pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus nuo 2009 m. buvo vykdomas statinių statybos procesas maitinimo, poilsio paslaugų teikimui, atliekant naujų statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinio remonto atlikimą.
4.1.3	Rekreacijos aptarnavimo centrų plėtra Radviliškio mieste (RajBP 3.5.11.)	Parengtos rekreacijos centrų plėtros programos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

4.2	Želdynų teritorijų sistemos vystymas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.2.1	Miesto ir/ar miesto prieigų miškingumo didinimas	Parengti kraštovaizdžio atkūrimo, miškotvarkos projektai Gausinami Radviliškio priemiesčio ir miesto miškų plotai ir numatomos jungtys su būsimais Mūšos – Nevėžio geoekologinės takoskyros miškais (bendrojo plano sprendiniai numato 30 proc. padidėjusį miškingumą)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija VĮ Valstybinė miškų urėdija - Radviliškio regioninis padalinys	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
4.2.2	Miesto želdynų/želdinių stebėsenos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	Parengta ir įgyvendinta stebėsenos sistema (periodiškai inventorizuojami želdynai ir želdiniai, stebima jų kokybė bei būklė)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Igyvendinta	2019-12-10	Buvo parengtas Radviliškio rajono savivaldybės želdinių ir želdynų inventorizacijos bei jų tvarkymo projektas 2013-2017 metams. Šio projekto metu buvo inventorizuoti (GIS taškiniu būdu nužymėti) Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke ir Eibariškių

										parke esantys želdiniai. 2019 m. Radviliškio rajono savivaldybės užsakymu buvo parengtas Radviliškio miesto parko (Radvilų g.) želdinių inventORIZACIJOS ir tvarkymo projektas.
4.2.3	Eibariškių parko teritorijos išplėtimas, pritaikymas visavertei rekreacijai (SPP 1.4.2.6)	Suformuotas sklypas parko teritorijai Parengtas parko sutvarkymo projektas Sutvarkytas parkas bei jame esantis vandens telkinys/-iai rekreacijai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma	2019-09-04	Suformuotas sklypas parko teritorijai (Unik. Nr. 4400-4395-6647), šiaurinėje parko dalyje tiesiami takai, tvarkomi želdiniai. Numatomas želdinių, mažosios architektūros įrengimas, vakarinėje dalyje pažintinio tako, apžvalgos bokšto įrengimas, erdvės aktyvesniam laisvalaikiui: sporto aikštelės, įrenginiai.

4.2.4	Aušros aikštės ir gretimų teritorijų sutvarkymas (SPP 1.4.2.4.)	Parengtas aikštės sutvarkymo techninis projektas Atlikti aikštės sutvarkymo darbai Įrengtos automobilių stovėjimo vietos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2013	2018	Igyvendinta		Sutvarkytos aplinkinės gatvės, įrengta mažoji architektūra, fontanai, atlikti apželdinimo darbai rekonstruota sankryža, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengti įrenginiai SPTŽ, infrastruktūra pėsčiųjų susisiekimui, inžinerinės infrastruktūros įrenginiai (paviršinio vandens surinkimo tinklai).
4.2.5	Laisvalaikio ir pramogų parko poilsio infrastruktūros įrengimas (SPP 1.4.2.5.)	Įrengta poilsio infrastruktūra parke (Radvilų g.), parkas pritaikytas laisvalaikio reikmėms	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2017	Igyvendinta		2016 m. buvo parengtas Radviliškio miesto Kultūros ir poilsio parko (Radvilų g.) sutvarkymo projektas. Projekto sprendiniai buvo įgyvendinti 2017 m. 2019 m. buvo parengtas projektas „Radviliškio miesto Kultūros ir poilsio parko teritorijos nusausinimo sistemų statyba“.

4.2.6	Skverų įrengimas	Parengti skverų (Povyliaus ir Daujočių gatvėse) sutvarkymo projektai įrengti ir pritaikyti skverai laisvalaikio reikmėms	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
-------	------------------	--	---	-----------------------------	--	------	------	-------------------	--	--

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Miesto teritorijoje vyko viešųjų erdvių pritaikymo visaverčiam laisvalaikio praleidimui procesai: sutvarkyta reprezentacinė miesto aikštė, vykdomi darbai Eibariškių parko sutvarkymui ir pritaikymui sportinei, pažintinei rekreacijai, parengtas ir įgyvendintas projektas Radviliškio m. Kultūros ir poilsio parko (Radvilų g.) sutvarkymui, vyko poilsio, maitinimo paslaugas teikiančių objektų plėtra, modernizavimo darbai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
5.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų vystymas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
5.1.1	Urbanistinės vertės požymių turinčių teritorijų įtraukimas į kultūros vertybių registrą	Inicijuotas Radviliškio miesto istorinio centro vertingųjų savybių nustatymas – urbanistinės vertės požymių tyrimas, parengti teritorijų planavimo dokumentai ribų nustatymui, apsaugai ir teritorijos tvarkymui, teritorija įtraukta į Kultūros vertybių registrą	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

5.1.2	Kultūros išteklių pritaikymas turizmui	Pritaikyti turizmui ir lankymui kultūrinio istorinio paveldo objektai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Nuolat vykdomi į Kultūros vertybių registrą įrašytų laidojimo vietų tvarkymo darbai viešajam pažinimui, viešajai pagarbai. Geležinkelio stoties pastatų kompleksas pritaikytas kultūriniam pažintiniam turizmui.
5.1.3	Tvarkybos reikalavimų nustatymas kultūros vertybėms (SPP 3.3.1.6.)	Atlikti papildomi kultūrinės vertės tyrimai vėjo malūno (J. Basanavičiaus g.), rašytojo Jono Marcinkevičiaus tėviškės namo (Laisvės al.), Evangelikų-liuteronų pastatų komplekso (S. Dariaus ir S. Girėno g.) Nustatyti tvarkybos reikalavimai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Kultūros paveldo departamentas	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2018-11-05	2014 m. balandžio 1 d. buvo įregistruotas patikslinimas dėl Radviliškio vėjo malūno (kodas 11100). 2016 m. spalio 18 d. buvo įregistruotas patikslinimas dėl rašytojo Jono Marcinkevičiaus memorialinio namo (kodas 11103). 2018 m. lapkričio 5 d. buvo įregistruotas patikslinimas dėl evangelikų liuteronų bažnyčios pastato (kodas 4435) 2009 m. buvo parengta Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema

5.1.4	Švč. Mergelės Marijos bažnyčios varpinės kompozicinio vaidmens įtvirtinimas	Išsaugotas dominuojantis Šv. Mergelės Marijos bažnyčios varpinės miesto centre vaidmuo, nustatant jos apsaugos (buferinę) zoną ir statybos šioje zonoje reglamentą	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Kultūros paveldo departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Saugojamas dominuojantis Šv. Mergelės Marijos bažnyčios varpinės vaidmuo miesto centrinėje dalyje.
5.2	Kultūros vertybių priežiūra ir tvarkymas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
5.2.1	Kultūros vertybių ir/ar jų aplinkos lankymui pritaikymas	Sutvarkytas Radviliškio miesto vėjo malūnas ir jo aplinka kultūrinio pažintinio turizmo reikmėms Sutvarkytos į Kultūros vertybių registrą įrašytos laidojimo vietos viešajam pažinimui, viešajai pagarbai, kultūriniam turizmui Pritaikytas Geležinkelio stoties pastatų kompleksas kultūriniam pažintiniam turizmui	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio Turizmo informacijos centras	Kita		2008	2019	Vykdoma	2019-12-01	Igyvendinamas LKT finansuojamas projektas „Išgirsk, pajusk, pažink geležinkeliečių kraštą“ Gauti virtualios realybės akiniai su programa apie Radviliškio geležinkelio istoriją, bus vykdomos edukacijos. Radviliškio vėjo malūnas (kodas KVR 11100) nesutvarkytas, nes privatus ir savininkai netvarko. Aplinka tvarkoma Radviliškio seniūnijos. Pastoviai

										tvarkomos į Kultūros vertybių registrą įrašytos laidojimo vietos viešajam pažinimui, viešajai pagarbai. Geležinkelio stoties pastatų kompleksas pritaikytas kultūriniam pažintiniam turizmui.
5.2.2	Privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmo parengimas ir įdiegimas	Priimti sprendimai dėl mokesčių lengvatų ir patvirtintas kompensavimo mechanizmas, parengti dokumentai nuosekliam kultūros vertybių išsaugojimo ir tvarkymo procesui	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

5.2.3	Visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkams ir naudotojams šių objektų vertės išsaugojimo ir naudojimo rekomendacijų parengimas ir įteikimas	Parengtos kultūros paveldo objektų naudojimo rekomendacijos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Kultūros paveldo departamentas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		Šiuo metu priemonė neaktuali. Neparengtos kultūros paveldo objektų naudojimo rekomendacijos, nes nėra poreikio. Šias rekomendacijas atstoja galiojantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti įstatyminiai aktai.
-------	--	---	---	-----------------------------	--	------	------	-------------------	--	---

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Igyvendintos priemonės, susijusios su mieste esančių kultūros vertybių (Radviliškio vėjo malūno, rašytojo Jono Marcinkevičiaus memorialinio namo, Evangelikų liuteronų bažnyčios pastato) vertingųjų savybių, jų pobūdžio, reikšmingumo lygmens patikslinimu kultūros vertybių registre. Didelė dalis priemonių yra tęstinės, todėl įgyvendinamos nuolat (viešajam pažinimui, pagarbai kultūros vertybių registre esančių laidojimo vietų tvarkymas, kultūros vertybių populiarinimas, supažindinimas su jų istorija, aplinkos tvarkymas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Komplikuojasi kultūros vertybių, kurios yra privačios nuosavybės teise valdomos, tvarkymo darbai. Nustatyta bendrajame plane numatyta, tačiau šią dieną neaktuali priemonė – vertės išsaugojimo ir rekomendacijų rengimas ir įteikimas savininkams, kadangi kultūros vertybių išsaugojimą, paveldosaugos reikalavimų laikymosi priežiūros, vertybių pažinimo, naudojimo sąlygas, tvarkybos, kultūros paveldo objektų būklės stebėjimo teisinius pagrindus nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Susisiekimo infrastruktūra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		
6.1	Geležinkelio infrastruktūros gerinimas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
6.1.1	Geležinkelio ruožo rekonstravimas ir modernizavimas	Rekonstruotas ir modernizuotas mieste esančio geležinkelio ruožas pagal AGC reikalavimus 120 – 160 km/h greičiui, įskaitant antrųjų kelių statybą ir signalizacijos sistemos modernizavimą	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
6.1.2	Geležinkelio ruožo elektrifikavimas	Igyvendinti geležinkelio infrastruktūros elektrifikavimo darbai	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

6.1.3	Geležinkelio infrastruktūros objektų modernizavimas	Igyvendinami geležinkelio stočių modernizavimo bei rekonstravimo darbai	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Igyvendinta		Igyvendintas stoties pastato rekonstrukcijos II etapas
6.2	Kelių tinklo infrastruktūros gerinimas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
6.2.1	Naujų gatvių plėtra urbanizuojamose teritorijose	Įrengtos naujos gatvės miesto plėtros teritorijose	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma		Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ viešai prieinamais duomenimis 2008 - 2019 metų laikotarpiu Radviliškio miesto teritorijoje buvo išduota 17 statybos leidimų naujų gatvių įrengimui.

6.2.2	Miesto gatvių ir jų elementų sutvarkymas	Parengti gatvių rekonstravimo techniniai projektai Rekonstruotos Radviliškio miesto gatvės: sutvarkytos gatvių važiuojamosios dalys, įrengta pėsčiųjų saugiam eismui trūkstama infrastruktūra (šaligatviai) Rekonstruota ir iki Gedimino g. įrengta, užtikrinant BP priskiriamos C1 kategorijos statusą, Žalgirio g. Rekonstruota ir iki Gedimino g. įrengta, užtikrinant BP priskiriamos C1 kategorijos statusą, Sodų g.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2008	2019	Vykdoma		2017 - 2019 m. rekonstruota Gedimino g. atkarpa nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Laisvės al.; 2018 - 2019 m. rekonstruota Gedimino g. atkarpa tarp Radvilų g. ir Stadiono g. įrengiant žiedinę sankryžą. 2016 m. atlikti Radviliškio miesto Vytauto g. RD8074 šaligatvio kapitalinio remonto darbai. 2017 - 2019 m. rekonstruota S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvė tarp Gedimino g. ir Vasario 16-osios g. 2015m. atnaujintas pėsčiųjų takas Vaižganto g. 2019 m. atnaujinta asfaltbetonio danga M. Mažvydo g. atkarpoje nuo magistralinio kelio A9 Panevėžys - Šiauliai iki Ryto al. įrengiant išlyginamąjį asfaltbetonio
-------	--	---	--	------	--	------	------	---------	--	---

										dangos sluoksnį. 2009 - 2011 m. Eglių ir Ažuolų g.: gatvių atkarpos su žvyro danga asfaltavimas ir susidėvėjusios asfalto dangos keitimas (645 m, 6 m pločio), šaligatvių ir nuovažų įrengimas, lietaus kanalizacijos įrengimas.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

6.2.3	Miesto gatvių rekonstravimas joms priskirtų kategorijų užtikrinimui	Rekonstruotos gatvės, užtikrinant joms priskirtų kategorijų atitikimą: B2: Šiaulių, Gedimino, Vytauto, A. Povyliaus gatvės C1: Maironio, S. Dariaus ir S. Girėno, Vaižganto, M. Mažvydo gatvės C2: Radvilų, Žironų, Eglių gatvės	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Kita		2008	2019	Vykdoma		2017 - 2019 m. rekonstruota Gedimino g. atkarpa nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Laisvės al.; 2018 - 2019 m. rekonstruota Gedimino g. atkarpa tarp Radvilų g. ir Stadiono g. įrengiant žiedinę sankryžą. 2016 m. atlikti Radviliškio miesto Vytauto g. RD8074 šaligatvio kapitalinio remonto darbai. 2017 - 2019 m. rekonstruota S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvė tarp Gedimino g. ir Vasario 16-osios g. 2015m. atnaujintas pėsčiųjų takas Vaižganto g. 2019 m. atnaujinta asfaltbetonio danga M. Mažvydo g. atkarpoje nuo magistralinio kelio A9 Panevėžys - Šiauliai iki Ryto al. įrengiant išlyginamąjį asfaltbetonio
-------	---	---	--	------	--	------	------	---------	--	--

										dangos sluoksnį. 2009 - 2011 m. Eglių ir Ažuolų g.: gatvių atkarpos su žvyro danga asfaltavimas ir susidėvėjusios asfalto dangos keitimas (645 m, 6 m pločio), šaligatvių ir nuovažų įrengimas, lietaus kanalizacijos įrengimas.
6.2.4	Miesto gatvių asfaltavimas	Įrengta asfalto danga rajoninio kelio Nr. 3408 ruožui, esančiam miesto teritorijoje	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
6.2.5	Automobilių stovėjimo aikštelių plėtra (SPP 1.4.1.7.)	Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės miesto centre, daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijose	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		Įrengtos automobilių stovėjimo vietos Gedimino g., įgyvendinant Aušros aikštės ir jos aplinkinių teritorijų sutvarkymo projektą

6.2.6	Pervažų statyba	Įrengta dviejų lygių pervaža ruože Linkaičiai – Radviliškis	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
6.3	Viešojo transporto paslaugų gerinimas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.3.1	Viešojo transporto paslaugų gerinimas	Racionalizuota ir įgyvendinta viešojo transporto paslaugų plėtra: vietiniai, tarp miestiniai maršrutai peržiūrėti įvertinant gyventojų kasdienius ir savaitgalinius poreikius	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB "Emtra"	Kita		2008	2019	Vykdoma		Kasmet atnaujinamos Radviliškio miesto tvarkaraščių lentelės. Maršrutai derinami prie mokinių pavežėjimo. 2019 m. vasario mėn. buvo gauti trys Iveco Feniksbus autobusai. Šiais autobusais vežami keleiviai Radviliškio miesto maršrutuose. Dirbančių žmonių patogumui 2019 m. rugsėjo mėn. maršrutas Baisogala-Vaitiekūnai per Grinkiškį, Vosiliškį pratęstas iki

										Juodelių stotelės.
6.3.2	Viešojo transporto infrastruktūros gerinimas (SPP 1.1.3.1., SPP 1.1.3.2.)	Parengtas autobusų stoties rekonstravimo techninis projektas Rekonstruota miesto autobusų stotis Sutvarkytos viešojo transporto stotelės, pagal poreikį įrengtos naujos viešojo transporto stotelės	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija	Kita		2013	2019	Vykdoma		2015 m. buvo atliktas Radviliškio autobusų stoties kapitalinis remontas - atlikti fasado apšiltinimo darbai, pakeistos lauko durys, suremontuota laukimo salė, įrengti pritaikyti žmonėms su negali (ŽN) vidaus patalpos sanitarinėms reikmėms (tualetai), įrengtas motinos ir vaiko kambarys, suremontuotas lauko paviljono stogas, pakeista šaligatvio danga, įrengti mažosios architektūros elementai (suolai, šiukšlių dėžės). 2016 m. Radviliškio autobusų stotyje pradėjo veikti siuntų skyrius, 2018 m. - bilietų kasa. 2018 m. Radviliškio autobusų stočiai suteikta II stoties kategoriją.

6.4	Bevariklio transporto ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.4.1	Bevariklio transporto ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra (SPP 1.1.2.2., SPP 2.1.4.4.)	Įrengta dviračių transporto naudojimui ir eismo saugai reikiama infrastruktūra darbo vietų koncentravimo teritorijų ir gyvenamųjų teritorijų apjungimui, rekreacijai ir turizmui: dviračių takai, pervažos Įrengti dviračių nuomos punktai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Kita		2008	2019	Vykdoma	2015-05-21	Parengtas ir įregistruotas dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.
6.4.2	Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra (SPP 1.1.2.2., SPP 2.1.4.4.)	Įrengti šaligatviai, pėsčiųjų takai Įrengtas tunelis pėstiesiems po geležinkelio ties Gedimino g.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio miesto seniūnija AB „Lietuvos geležinkeliai“	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma	2015-05-21	Parengtas ir įregistruotas dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Buvo skiriamas dėmesys viešojo transporto paslaugų gerinimui ir prieinamumui specialiuosius poreikius turintiems asmenims (SPTŽ) (optimizuojami maršrutai, sprendžiant moksleivių pavežėjimo klausimus, įgytos naujos viešojo transporto priemonės, vyko viešojo transporto susisiekimo objektų modernizavimas (geležinkelio stoties pastato rekonstravimas (II etapas), autobusų stoties kapitalinis remontas).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Neįgyvendinta dalis darbų geležinkelio transporto infrastruktūros modernizavimui (nuo savivaldybės nepriklausančios aplinkybės): neatnaujinti bėgiai, neatlikti geležinkelio elektrifikavimo darbai). Didesnis dėmesys skiriamas infrastruktūros gerinimui asmeninio transporto naudojimo reikmėms, o ne darnų judumą skatinančioms priemonėms (susisiekimui dviračių, paspirtukų transportu, pėsčiomis ir pan.).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	Inžinerinė infrastruktūra					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 16 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 28		
7.1	Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
7.1.1	Vandens tiekimo tinklų plėtra esamose urbanizuotose teritorijose (SPP 1.3.1.1.)	Įrengti vandens tiekimo tinklai Eibariškių rajone (aprūpinimas 100 proc. vartotojų), Gražinos, Maironio gatvių, Lukšio, Pašvaistės ir Biliūno gatvių, Mažvydo gatvės rajonuose (aprūpinimas daugiau nei 95 proc. vartotojų)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		2010 m. parengtas Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. 2015 m. įgyvendintas ES projektas VP3-3.1-AM-01-V-02-101 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir 2015 m. įgyvendintas ES projektas VP3-3.1-AM-01-V-02-101 "Vandens tiekimo ir

										nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio mieste. Šiuo metu tinklai įrengti Eibariškių rajone, Gražinos, Maironio, Lukšio Pašvaistės Biliūno bei Mažvydo gatvėse.
7.1.2	Vandens tiekimo tinklų plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose, sodininkų bendrijų konversijos teritorijose (SPP 1.3.1.1.)	Įrengti vandens tiekimo tinklai Daujočių, J. Basanavičiaus, Saulėtekio g. rajonuose, Geležinkelio g. kvartale (aprūpinimas iki 95 proc. vartotojų) bei tarp Gedimino ir Vingėlišio gatvių planuojamame gyvenamajame rajone, sodų konversijos teritorijoje Eibariškių rajone bei Mažvydo g. sodininkų bendrijų konversijos teritorijoje	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		Šiuo metu yra parengti projektai dėl infrastruktūros įrengimo Basanavičiaus ir Daujočių g. rajonuose. Saulėtekio g. rajone tinklai jau yra įrengti. Iki 2020 m. numatyta pakloti 1,18 km naujų vandentiekio tinklų. Paslaugos bus prieinamos dar 67 gyvenamiesiems būstams

7.1.3	Vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas (SPP 1.3.1.2.)	Rekonstruoti miesto vandens gerinimo įrenginiai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Įgyvendinta		2016 m. įgyvendintas ES projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0009 "Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija". Šio projekto dėka buvo rekonstruoti Radviliškio vandens nugeležinimo įrenginiai.
7.1.4	Nuotekų siurblių plėtra	Įrengtos nuotekų siurblinės Eibariškių rajone, Vaižganto g., Maironio g. rajonuose, šiaurės vakarų miesto dalyje pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų aplinkoje.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		Eibariškių rajone ir Maironio g. buvo įrengtos siurblinės bei kita infrastruktūra. Siurblinės Vaižganto g. nebuvo įrengtos.

7.1.5	Nuotekų surinkimo tinklų plėtra (SPP 1.3.1.1.)	Įrengti nuotekų surinkimo tinklai Daujočių, J. Basanavičiaus, Saulėtekio g. rajonuose, Geležinkelio g. kvartale (aprūpinimas mažiau nei 95 proc.) bei tarp Gedimino ir Vingėlišio gatvių planuojamame gyvenamajame rajone, sodų konversijos teritorijoje Eibariškių rajone bei Mažvydo g. sodininkų bendrijų konversijos teritorijoje.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		Numatoma įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Basanavičiaus ir Daujočių g. Saulėtekio g. tinklai jau yra įrengti. Iki 2020 m. bus paklota 1,86 km nuotekų surinkimo tinklų. Paslaugos taps prieinamos dar 67 būstams
7.1.6	Lietaus nuotekų surinkimo tinklų plėtra (SPP 1.3.2.2)	Įrengti lietaus nuotekų surinkimo tinklai pirmiausiai palei esamą geležinkelį einančiose gatvėse, vadovaujantis bendrajame plane nustatytais lietaus nuotekų surinkimo organizavimo ir plėtros zonomis. Įrengti kolektoriai lietaus nuotekų surinkimui į esamus lietaus nuotekų surinkimo tinklus nuo Kėstučio ir Gedimino gatvių	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal poreikį, pagal gretutinių projektų įgyvendinimą

		kampo. Nuvesti lietaus kanalizacijos kolektoriai nuo teritorijos apribotos Eglių, Alyvų, Žalgirio gatvėmis, į esamus lietaus surinkimo tinklus Vilniaus gatvėje. Pratęsti Taikos gatvės uždari kolektoriai kitapus Maironio gatvės, uždarytas griovys tarp gyvenamųjų pastatų (Maironio g. 86-88).								
7.1.7	Lietaus nuotekų valymo įrenginių plėtra (SPP 1.3.2.2.)	Įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginiai J. Basanavičiaus, Geležinkelio, Transporto gatvėse bei prieš Prūdėlio gatvę kitapus bėgių esančioje gatvėje, Sodų gatvėje.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
7.1.8	Lietaus nuotekų surinkimo sistemos atskyrimas nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos (RajBP 7.2)	Atskirti lietaus nuotekų surinkimo tinklai nuo buitinių nuotekų surinkimo tinklų Vasario 16- osio gatvėje (prieš Kudirkos mokyklą), Žalgirio gatvėje, Maironio gatvėje (ties savivaldybe).	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Kita		2008	2019	Vykdoma		Atskirtos lietaus vandens surinkimo ir buitinio nuotakyno surinkimo sistemos Radviliškio mieste. Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. yra taikomas mokestis už paviršinių nuotekų tvarkymą.

7.1.9	Lietaus nuotekų surinkimo įrenginių įrengimas pro geležinkelį (SPP 1.3.2.2.)	Įrengtas ištekėjimas pro geležinkelį	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
7.1.10	Lietaus nuotekų surinkimo tinklų renovacija (SPP 1.3.2.2.)	Renovuoti lietaus nuotekų surinkimo tinklai M. Mažvydo 12 A-F esančioje teritorijoje.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio vanduo“	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
7.2	Atliekų ir apleistų teritorijų tvarkymas					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.2.1	Esamo Radviliškio KBA sąvartyno (Žironų) uždarymas (RajBP 7.3)	Parengtas uždarymo projektas su apsaugos priemonėmis bei parinktas geriausias rekultivavimo būdas. Uždarytas ir rekultivuotas esamas Radviliškio sąvartynas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Kita		2008	2014	Įgyvendinta		2014 m. įgyvendintas ES projektas VP3-3.2-AM-01-V-01-005 "Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas", kurio metu uždarytas Radviliškio sąvartynas.

7.2.2	Antrinių žaliavų surinkimo aikštelių įrengimas, sutvarkymas (SPP 1.3.4.1., SPP 1.3.4.2.)	Rekonstruotos esamos konteinerių aikštelės įrengtos naujos konteinerių aikštelės	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Kita		2008	2019	Vykdoma		Iki 2016 m. Radviliškio mieste buvo įrengtos 36 antrinių žaliavų surinkimo aikštelės (konteinerių vietos). 2019 metais rengiamas projektas "Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Radviliškio r. sav. teritorijoje supaprastintas statybos projektas". Mieste numatomos 34 statyb vietės pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimui.
7.2.3	Apleistų statinių ir teritorijų tvarkymas (SPP 1.3.3.2.)	Nugriauti ir/arba esant reikalui rekonstruoti visi apleisti ūkiniai statiniai, racionaliai panaudotos, perdirbtos griovimo atliekos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2015	Nepradėta vykdyti		

7.3	Šilumos ūkis					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
7.3.1	Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas (SPP 1.4.1.3)	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2014	Igyvendinta	2014-03-24	Parengtas ir įregistruotas Radviliškio rajono šilumos ūkio specialusis planas
7.3.2	Išsamios analizės apie esamą šilumos gamybos būklę parengimas, šilumos gamybos patikimumo didinimo priemonių įrengimas (SPP 1.2.1.2)	Parengta išsami analizė apie esamą šilumos gamybos būklę ir pagal pateiktas išvadas bei veiksmų planą įgyvendintos šilumos gamybos patikimumo didinimo priemonės	UAB „Radviliškio šiluma“	Savivaldybės biudžeto lėšos		2009	2019	Vykdoma		2008 m. atlikta naujos katilinės aprūpinimo medienos ištekliais galimybių studija.
7.3.3	Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra esamose urbanizuotose ir miesto plėtros teritorijose (SPP 1.2.1.1.)	Įrengti nauji centralizuoti šilumos tiekimo tinklai ir prijungti nauji šilumos vartotojai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio šiluma“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2008	2019	Vykdoma		Šilumos tiekimo sistema išplėsta 544,81 m 2008 metais, 48,07 m 2016 metais, 732,71 m 2018 metais. Prijungti nauji vartotojai.
7.3.4	Esamų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas (SPP 1.2.1.1.)	Renovuoti esami šilumos tiekimo tinklai Pakeisti orinės šilumos tiekimo trasos požeminėmis	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio šiluma“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2008	2019	Vykdoma		Iki šiol yra atnaujinta 13966,71 m trasų, planuojama atnaujinti dar 2313,29 m tinklų.

7.3.5	Biokuro katilinės įrengimas (SPP 1.2.3.2.)	Mieste pastatyta biokuro katilinė	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio šiluma“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2008	2019	Igyvendinta		Pastatyta biokuro katilinė su sandėliu ir kondensaciniu ekonomizaizeriu, kogeneraciniu įrenginiu.
7.3.6	Esamos katilinės veiklos ir patikimumo įvertinimas ir užtikrinimas (SPP 1.2.3.4.)	Galimybių studijos parengimas dėl kogeneracinių įrenginių rajoninėje katilinėje diegimo Atlikta Radviliškio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilą, kondensacinį ekonomizaizerį, kogeneracinį įrenginį	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio šiluma“	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2015	Igyvendinta		2015 m. įgyvendintas projektas "Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį": atliktas Radviliškio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilą, kondensacinį ekonomizaizerį, kogeneracinį įrenginį
7.3.7	Sanitarinės apsaugos zonos nustatymas katilinei (RajBP 7.4)	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, kiti projektai SAZ nustatymui	Radviliškio rajono savivaldybės administracija UAB „Radviliškio šiluma“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2009	2015	Igyvendinta	2015-01-09	2014 m. lapkričio 12 d. parengta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 2015 m. sausio 9 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro sprendimu nustatyta SAZ riba.

7.4	Gamtinių dujų tiekimas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
7.4.1	Dujų tiekimo infrastruktūros plėtra	Parengti techniniai ir kiti projektai, įrengti nauji skirstomojo dujotiekio tinklai ir prijungti nauji vartotojai esamose ir planuojamose daugiabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose, komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, kuriose nėra planuojama vystyti centrinių šilumos tiekimo tinklų ir vartotojų šildymo poreikiams tenkinti numatoma naudoti gamtines dujas	AB „ESO“, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2008	2019	Vykdoma		2008 - 2019 m laikotarpiu įrengta 26,478 km naujo skirstomo dujotiekio. Prijungta 186 vnt. dujų vartotojų.

7.5	Elektros tiekimas					2008	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
7.5.1	Transformatorių pastočių (10/0,4kV) plėtra	Parengti techniniai projektai, įrengtos transformatorinės pastotės	AB „ESO“, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2008	2019	Vykdoma		2008 - 2019 m. laikotarpiu buvo įrengta 17 (10/0,4kV) transformatorinių pastočių
7.5.2	Oro linijų (0,4 kV) rekonstravimas į kabelių linijas (RajBP 7.6)	Įrengti požeminiai elektros tinklai/kabeliai vietoj elektros oro tinklų	AB „ESO“, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2008	2019	Vykdoma		2008 - 2019 m. laikotarpiu buvo įrengta 12,2 km 0,4 kV požeminių elektros kabelių vietoj elektros oro tinklų.
7.5.3	Oro linijų (10 kV) rekonstravimas į kabelių linijas (RajBP 7.6)	Įrengti požeminiai elektros tinklai/kabeliai vietoj elektros oro tinklų	AB „ESO“, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2008	2019	Vykdoma		2008 - 2019 m. laikotarpiu buvo įrengta 0,98 km požeminių elektros kabelių vietoj 10 kV elektros oro tinklų.

7.5.4	Gatvių esamo apšvietimo sistemų atnaujinimas (SPP 1.2.1.8.)	Atnaujinta miesto gatvių esama apšvietimo sistema, vykdomas elektros energiją tausančių priemonių įdiegimas	AB „ESO“, Energijos skirstymo operatorius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		2012 - 2014 m. buvo vykdomi gatvių apšvietimo sistemos darbai Radviliškyje: įrengta 140 vnt. LED šviestuvų Vytauto, Jaunystės, Žalgirio, Radvilų, Maironio, Dariaus ir Girėno, Vaižganto gatvėse. 2016 m. buvo vykdomi pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo darbai. Sutvarkytos dalies gatvių apšvietimo sistemos mieste.
7.5.5	Miestų susisiekimo infrastruktūros apšvietimo plėtra (SPP 1.2.1.8.)	Įrengtas gatvių apšvietimas neapšviestose gatvėse, pėsčiųjų, dviračių takų, šaligatvių, viešųjų erdvių apšvietimas energiją tausančiomis priemonėmis	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2019	Vykdoma		2014 m. Radviliškyje įrengta 140 vnt. LED šviestuvų Vytauto, Jaunystės, Žalgirio, Radvilų, Maironio, Dariaus ir Girėno, Vaižganto gatvėse. LED šviestuvai įrengiami ir visuomeninių pastatų teritorijose.
7.6	Telekomunikacijų ir ryšių plėtra					2008	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

7.6.1	RAIN tinklo plėtra (RajBP 7.7)	Įrengti plačiajuosčio Interneto tinklai miesto teritorijoje	Radviliškio rajono savivaldybės administracija telekomunikacijų bendrovės	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		
7.6.2	Teritorijos rezervavimas telekomunikacinių įrenginių statybai (RajBP 7.7)	Rezervuota teritorija telekomunikacinių įrenginių statybai Suformuotas sklypas Įrengti telekomunikaciniai įrenginiai	Radviliškio rajono savivaldybės administracija telekomunikacijų bendrovės	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2008	2019	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


Nuosekliai buvo vykdomi elektros tinklų modernizavimo darbai, infrastruktūra keičiama į tausojančią ir draugiškesnę aplinkai. Prijungti nauji vartotojai dujų, centralizuotam šilumos tiekimui, vykdomi aplinkos apsaugai svarbūs procesai (biokuro katilinių plėtra ir atnaujinimo darbai), modernizuojama atliekų surinkimo sistema.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nepradėti vykdyti apleistų statinių ir teritorijų tvarkymo darbai.

II Išvados: 2018 - 2019 Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas

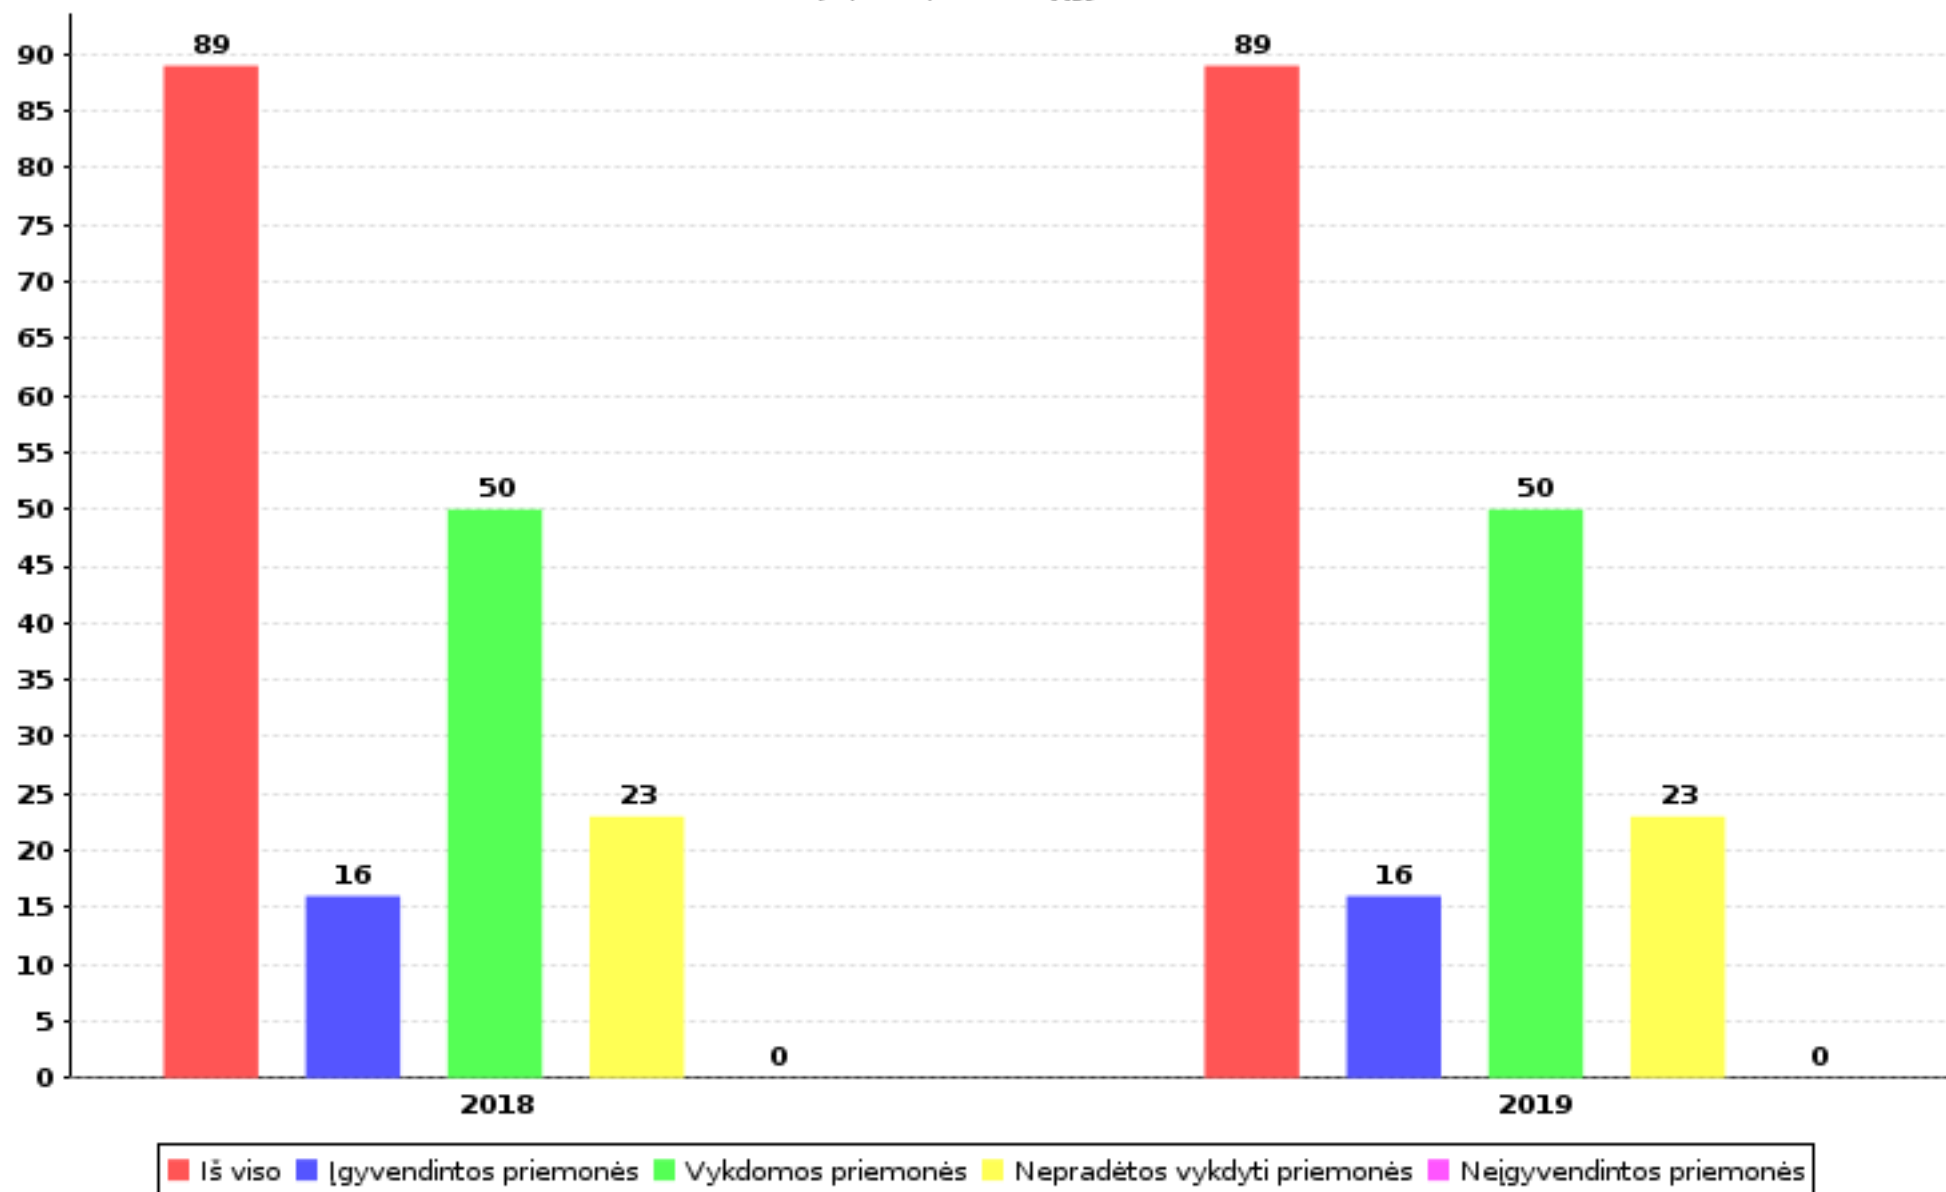


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

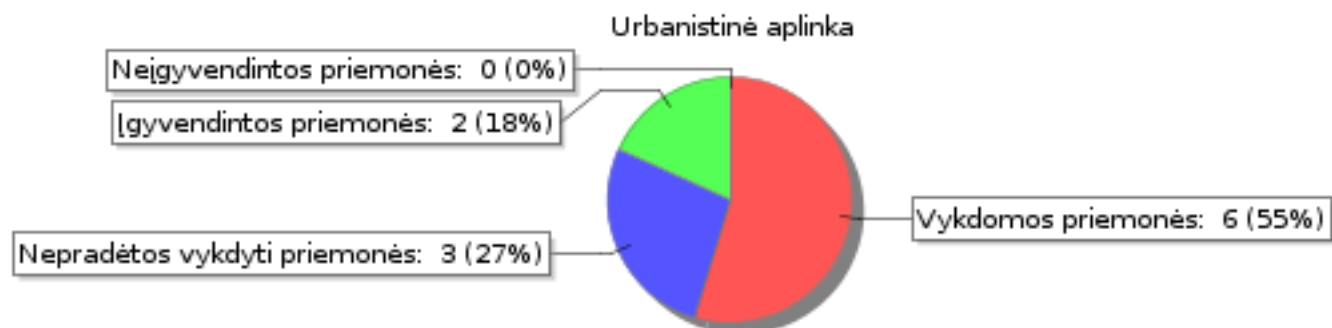


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

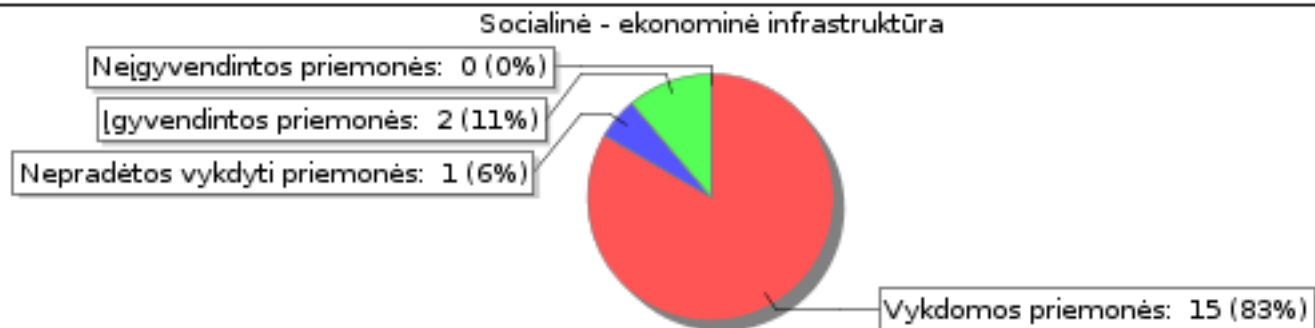


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio apsauga

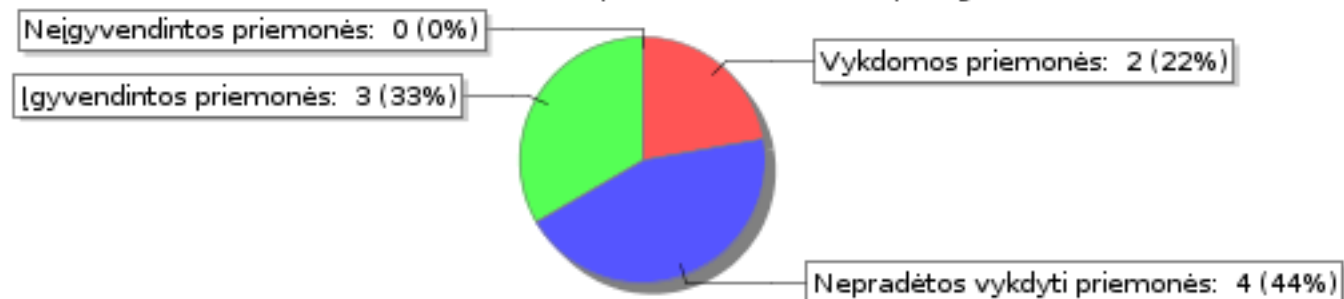


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos

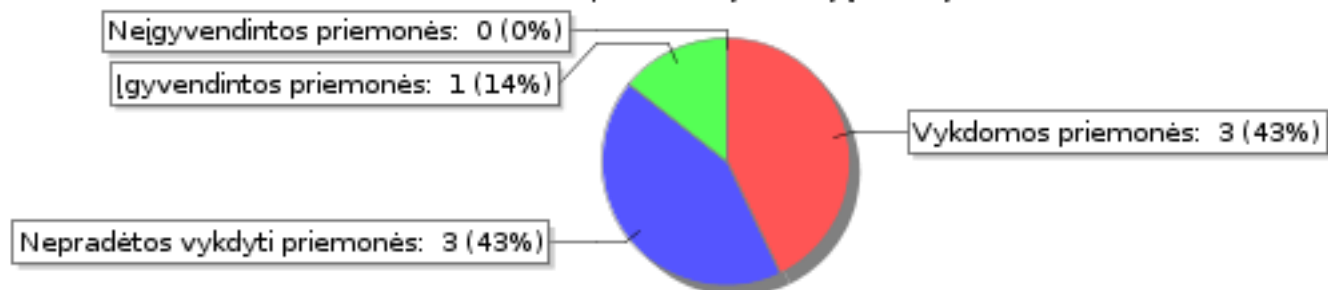


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Susisiekimo infrastruktūra

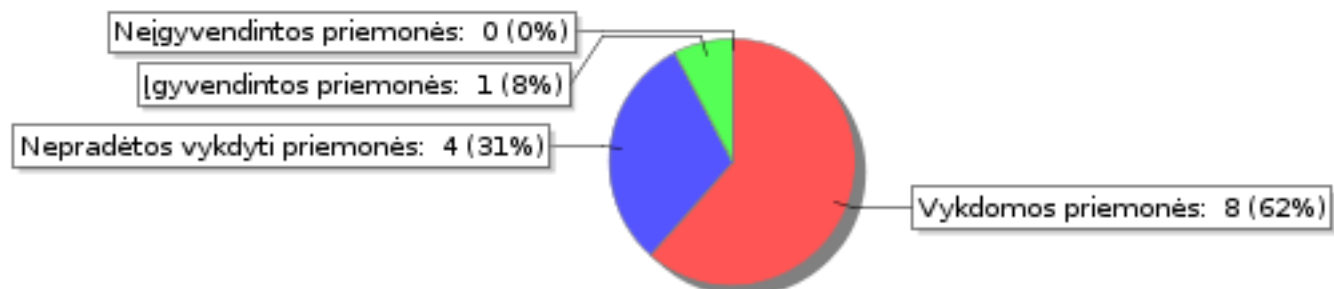

● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

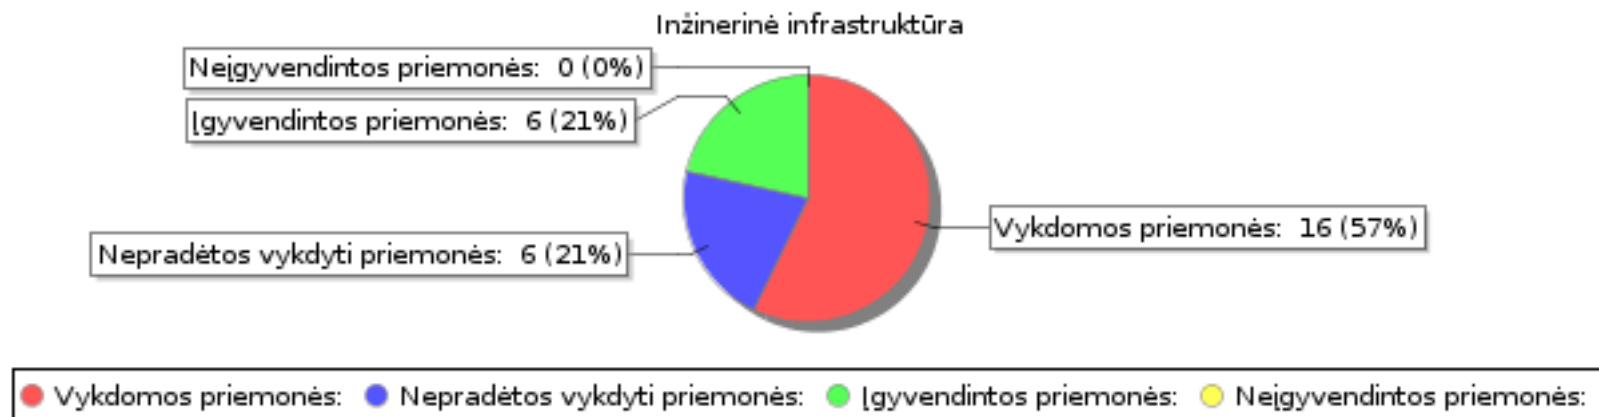

Įvertinus Radviliškio miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą 2008 - 2019 metais buvo pastebėta, kad mieste itin stipriai vyko gyvenimo kokybės gerinimo procesas, didelį dėmesį skiriant esamos infrastruktūros, urbanistinės aplinkos tvarkymui ir modernizavimui. Nebuvo vykdoma nesaikinga, paklausos neatitinkanti miesto plėtra. Vietomis stebimas ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo fragmentiškumas, kurį tikėtina galėjo riboti lėšų trūkumas ar iniciatyvų nebuvimas.

Dalis Radviliškio miesto bendrojo plano sprendinių šiuo metu yra praradę aktualumą ir reikalingumą, todėl turi būti atidžiai įvertinami ir peržvelgiami, nes tikėtina neatspindi šiandienos poreikių bei galimybių. Tai ypač akivaizdu vertinant Radviliškio miesto urbanistinį paveikslą. Radviliškio miesto bendrojo plano sprendiniai užprogramavo monofunkciškumą (vienas galimas žemės naudojimo būdas). Tokie sprendiniai visiškai neatitinka pasaulinių darnios plėtros principų nei Jungtinių Tautų Naujosios Urbanistinės Darbotvarkės tikslų. Monofunkciškumas riboja miesto rajonų diversifikavimą ir darnų vystymąsi.

Radviliškio miesto bendrajame plane nebuvo vertinamas miesto architektūrinis savitumas: nei Radviliškio miesto bendrojo plano sprendinių tekste nei brėžiniuose nėra identifiкуotos teritorijos, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis savitumas ar gairės kuriomis galėtų būti nustatomos šios teritorijos, ar faktai, kuriais remiantis būtų konstatuojama, kad ši priemonė nėra aktuali miesto teritorijai. Taip pat nėra numatytų priemonių/rekomendacijų, kuriomis vadovaujantis būtų tikslinga išlaikyti architektūrinį miesto teritorijų savitumą.

Mažai dėmesio galiojančiame bendrajame plane skiriama darnaus judumo skatinimo priemonėms. Kaip ir tendencingai visoje šalyje tuo metu rengiamuose bendruose planuose dviračių transportas buvo pozicionuojamas, kaip laisvalaikio reikmėms reikalinga priemonė, todėl susiję sprendiniai buvo nukreipiami laisvalaikio poreikių užtikrinimui, o ne kasdienių kelionių reikmėms, taip pat mažai dėmesio skirta pėsčiųjų susisiekimui ir ypač žmonių su specialiaisiais poreikiais (SPTŽ) judėjimui.

III. Prognozės

Radviliškio miesto geografinė padėtis, vertinant ją visos Lietuvos teritorijos kontekste, yra itin palanki: miestas yra tarp dviejų urbanistinių centrų Šiaulių ir Panevėžio, o tai leidžia Radviliškio miesto ekonominėms veikloms turėti arti esančius taškus, mieste pagamintos produkcijos realizavimui. Labai svarbi aplinkybė, kad Radviliškio miestas turi geležinkelio susisiekimo sistemą, kuri padeda vietos gyventojams patogiai keliauti, integruotis į esamus ir perspektyvinius logistikos procesus. Esama geležinkelio infrastruktūra palengvina ir prekių judėjimą. Žvelgiant į Europinės svarbos dokumentais apibrėžiamą geležinkelio transporto perspektyvą, svarbu išlaikyti geležinkelio logistikos procesus mieste ir ateityje. Vertinant sodų konversijos tendencijas, turėtų ir toliau keistis sodų bendrijų teritorijos, kurios pamažu visiškai virstų gyvenamąsias teritorijas: tai yra ryškiausia urbanistinės plėtros tendencija šiuo metu ir tikėtina, kad ji ateityje įtakos miesto vaizdą.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija periodiškai turėtų atlikti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo vertinimą, t.y. vykdyti priemonių įgyvendinimo stebėseną reguliariai ir kompleksiskai - stebėseną turi būti atliekama kas dvejus metus. Tai padėtų aiškiau įvertinti bendrojo plano įtaką miesto plėtros progresui, gyvenimo sąlygų gerėjimo tendencijas ir greičiau reaguoti į iškilusias problemas ar priežastis, dėl kurių tam tikros priemonės tampa itin aktualios ar mažiau svarbios.

Nuosekliai vykdomas sprendinių įgyvendinimo stebėjimas prisidėtų prie racialesnio ir realų poreikį atitinkančio biudžeto formavimo bei padėtų formuoti aiškius pagrindus ES paramos lėšų įsisavinimui.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

-

Dėl bendrojo plano keitimo:

Šiuo metu galiojantis Radviliškio miesto bendrasis planas buvo patvirtintas 2008 metais. Teisės aktais, galiojusiais iki 2014 metų buvo apibrėžti sprendinių galiojimo terminai. Sprendinių galiojimą nusakantis teisinis dokumentas „Teritorijų planavimo įstatymas“ bendrojo plano rengimo metu programavo sprendinių galiojimą 10-ies metų perspektyvai (žr. Teritorijų planavimo įstatymo redakcijų, galiojusių iki 2014 m. 11 straipsnio „Bendrojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas“ 2 punktą „2. Valstybės, apskrities, savivaldybių teritorijų ir savivaldybių dalių vystymo kryptys, erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o konkretūs sprendiniai – 10 metų laikotarpiui. Jų galiojimas gali būti pratęsiamas.“).

Vertinant iki 2014 metų rengtais teritorijų planavimo dokumentais programuotą sprendinių gyvavimo trukmę ir tik šiam laikotarpiui planuotus sprendinius, tikslinga atlikti bendrojo plano keitimo procesą, išsprendžiant galiojančio bendrojo plano monofunkcinio žemės naudojimo būdo problematiką, nagrinėjant miesto teritorijų savitumo klausimus, vertinant faktą, kad yra rengiami aukščiausio lygmens teritorijų planavimo dokumentai – šalies bendrasis planas, kurio apimtyje planuojama šalies ir jos gyvenamųjų vietovių perspektyva. Būtina apibrėžti reikalavimus bendrojo plano apimtyje nagrinėti ir teikti siūlymus darnaus judumo galimybių skatinimui (ypač didelis dėmesys turi būti nukreipiamas į kasdienių kelionių reikmes patogumo ir saugios aplinkos užtikrinimo prasme). Tenka pastebėti, kad šiuo metu apibrėžti tikslai bei galiojantys sprendiniai, vertinant aukščiau įvardintas priežastis ir aplinkybes, gali daugiau riboti miesto plėtrą negu ją skatinti.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

V. Priedai:
